
RELAI

기능 활용 가이드

처음 맡은 IT 프로젝트, 착수부터 운영까지 7단계.
화면으로 보는 RELAI의 모든 기능

기준 버전 batch6 · 2026.10.19
PC 1440px 화면 · 휴대폰 390px 화면
화면 속 프로젝트·이름은 모두 샘플 데이터입니다

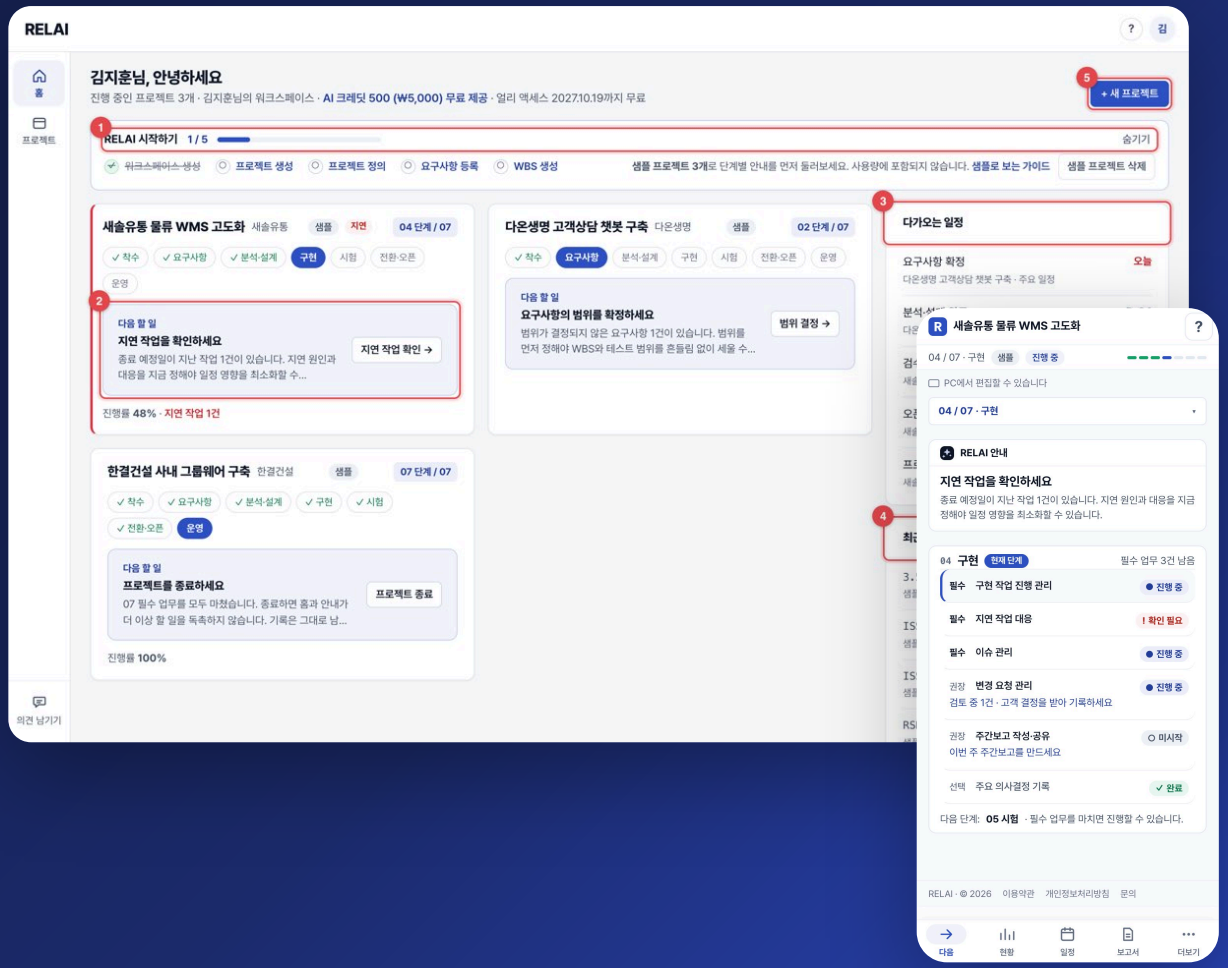

목차

01 가입·로그인 3

02 홈 5

03 프로젝트 만들기·샘플 7

04 7단계 흐름 9

- 프로젝트 개요 10
- 마일스톤 12
- 착수 14
- 요구사항 15
- WBS 17
- 이슈·리스크(RAID) 18
- 변경 요청 20
- 테스트·검수 21
- 주간보고·완료보고서 23
- 운영 인계 27

05 AI 기능 4종 29

- AI ① 요구사항 추출 29
- AI ② WBS 초안 31
- AI ③ 변경 영향 분석 34
- AI ④ RELAI에게 물어보기 36
- AI 크레딧 37

06 가이드 '샘플로 보기' 38

07 의견 남기기 39

08 설정·멤버 초대·크레딧 40

09 관리자 콘솔 42


10 휴대폰에서 보기 45

읽는 법 화면 위의 1 번호는 오른쪽(또는 아래) 설명의 번호와 같습니다. 각 쪽 **무엇을 · 어떻게 · 결과** 세 줄만 읽어도 기능을 이해할 수 있게 썼습니다.

01. 가입·로그인

이메일 하나로 가입하고, 바로 샘플 프로젝트 3개가 들어 있는 워크스페이스로 들어갑니다.

회원가입

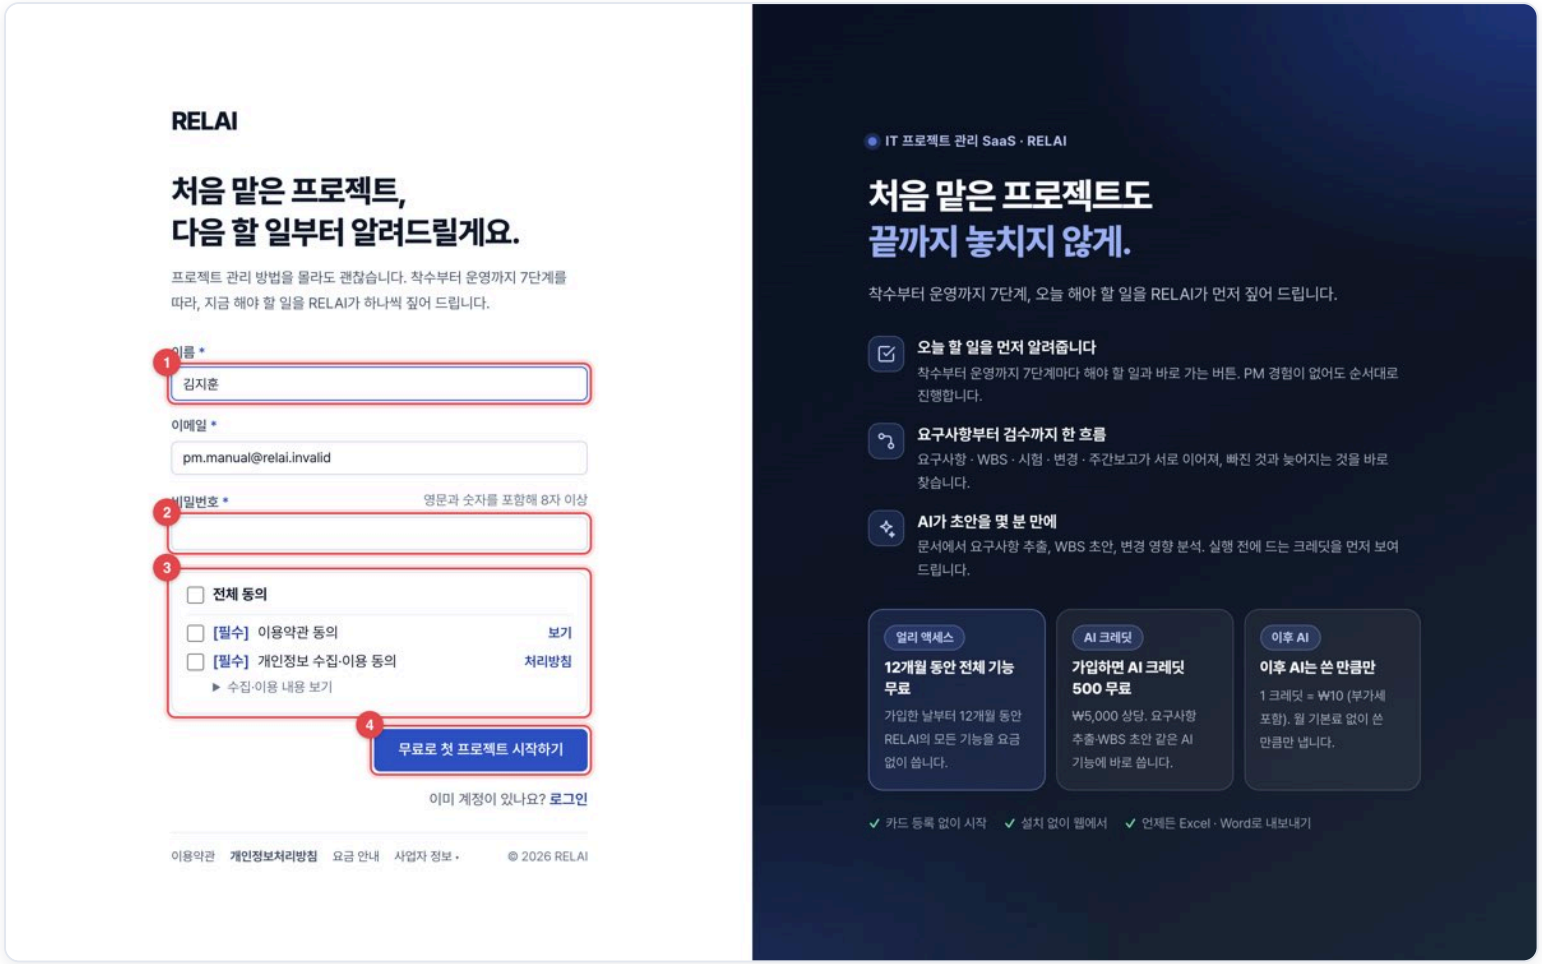


화면 번호 설명

1. 이름을 입력합니다. 이메일은 로그인 ID가 됩니다.
2. 비밀번호는 영문과 숫자를 포함해 8자 이상입니다.
3. 이용약관·개인정보 수집 동의(필수)를 체크합니다. 전체 동의 한 번으로 끝납니다.
4. [무료로 첫 프로젝트 시작하기]를 누르면 가입이 끝납니다.

무엇을	이름·이메일·비밀번호로 계정을 만듭니다.	어떻게	필수 약관 2개에 동의하고 시작 버튼을 누릅니다.	결과	내 워크스페이스가 생기고, 샘플 프로젝트 3개와 AI 크레딧 500이 바로 들어옵니다.


로그인과 이메일 인증

로그인

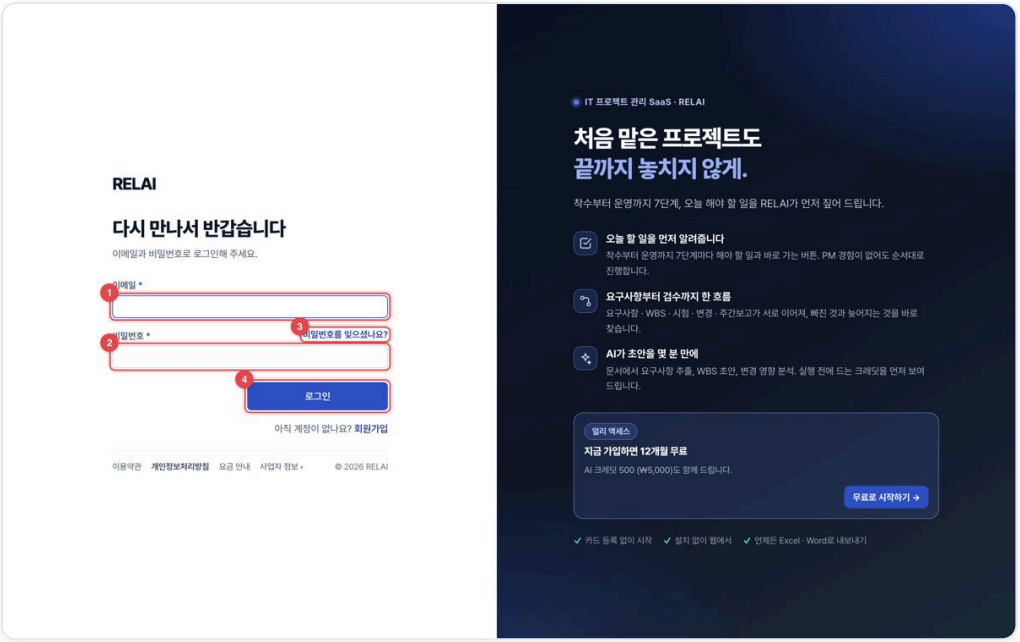

1. 이메일
2. 비밀번호
3. [비밀번호를 잊으셨나요?] — 재설정 메일을 받습니다.
4. [로그인]

가입 직후 — 이메일 인증 필요

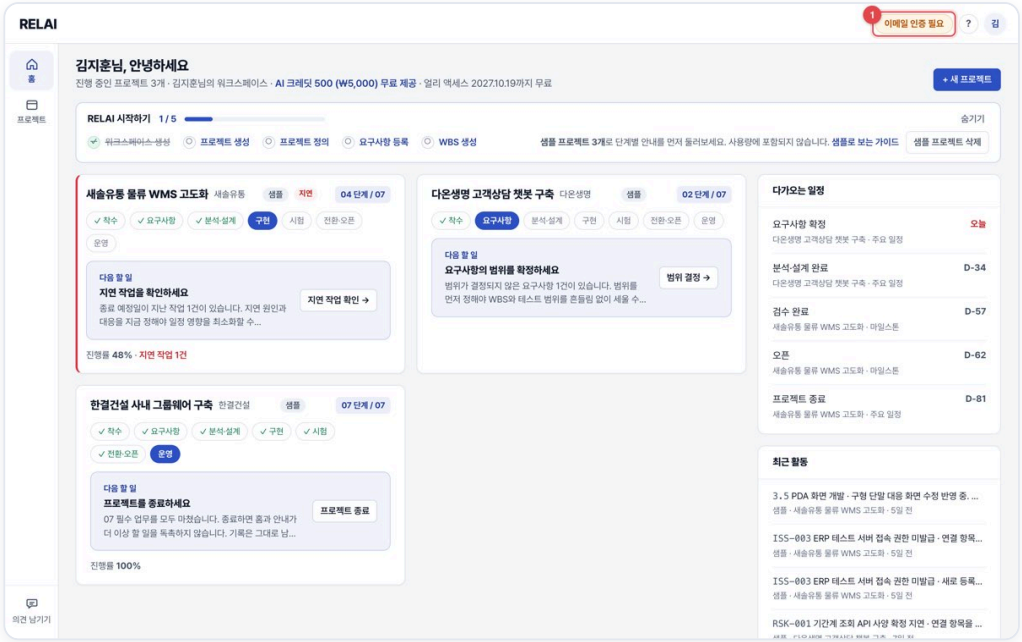


1. 가입 직후에는 상단에 [이메일 인증 필요]가 보입니다. 누르면 인증 메일을 다시 보냅니다. 인증 전에도 화면은 모두 둘러볼 수 있고, 팀원 초대·결제처럼 계정이 확실해야 하는 일만 인증 후에 열립니다.

무엇을	가입한 이메일로 다시 들어옵니다.	어떻게	이메일과 비밀번호를 넣고 [로그인]을 누릅니다.	결과	마지막으로 쓰던 워크스페이스의 홈으로 이동합니다.

02. 홈 로그인하면 가장 먼저 보는 화면입니다. 내 프로젝트마다 "다음 할 일"을 한 줄로 알려 줍니다.

홈 — 오늘 볼 것만 모은 화면

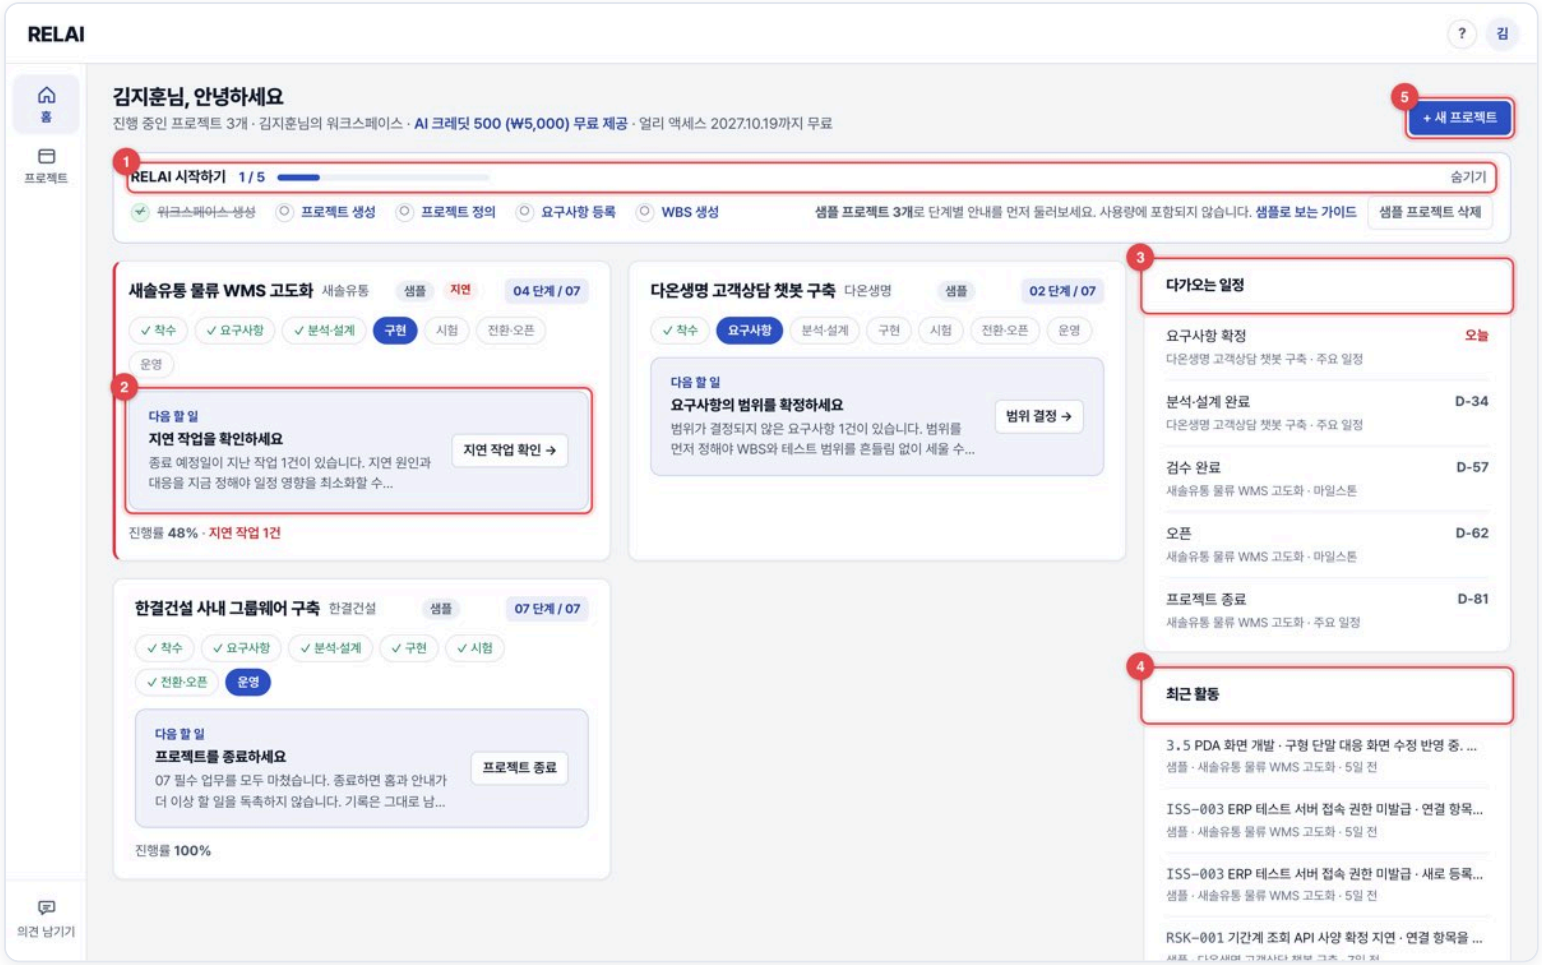


화면 번호 설명

1. RELAI 시작하기 — 첫 사용자를 위한 5단계 체크리스트(프로젝트 생성 → 프로젝트 정의 → 요구사항 → WBS). 다 하면 숨길 수 있습니다.
2. 프로젝트 카드 — 현재 단계(7단계 중 몇 번째)와 "다음 할 일"을 버튼과 함께 보여 줍니다. 지연이 있으면 빨간 표시가 붙습니다.
3. 다가오는 일정 — 모든 프로젝트의 마일스톤과 주요 일정을 D-day 순으로 모읍니다.
4. 최근 활동 — 요구사항·이슈·WBS가 바뀐 기록이 시간순으로 쌓입니다.
5. [+ 새 프로젝트]

무엇을	여러 프로젝트에서 지금 손대야 할 곳을 한 화면에서 찾습니다.	어떻게	카드의 "다음 할 일" 버튼을 누르면 해당 업무 화면으로 바로 갑니다.	결과	프로젝트 관리 방법을 몰라도 순서대로 따라가면 됩니다.

프로젝트 목록

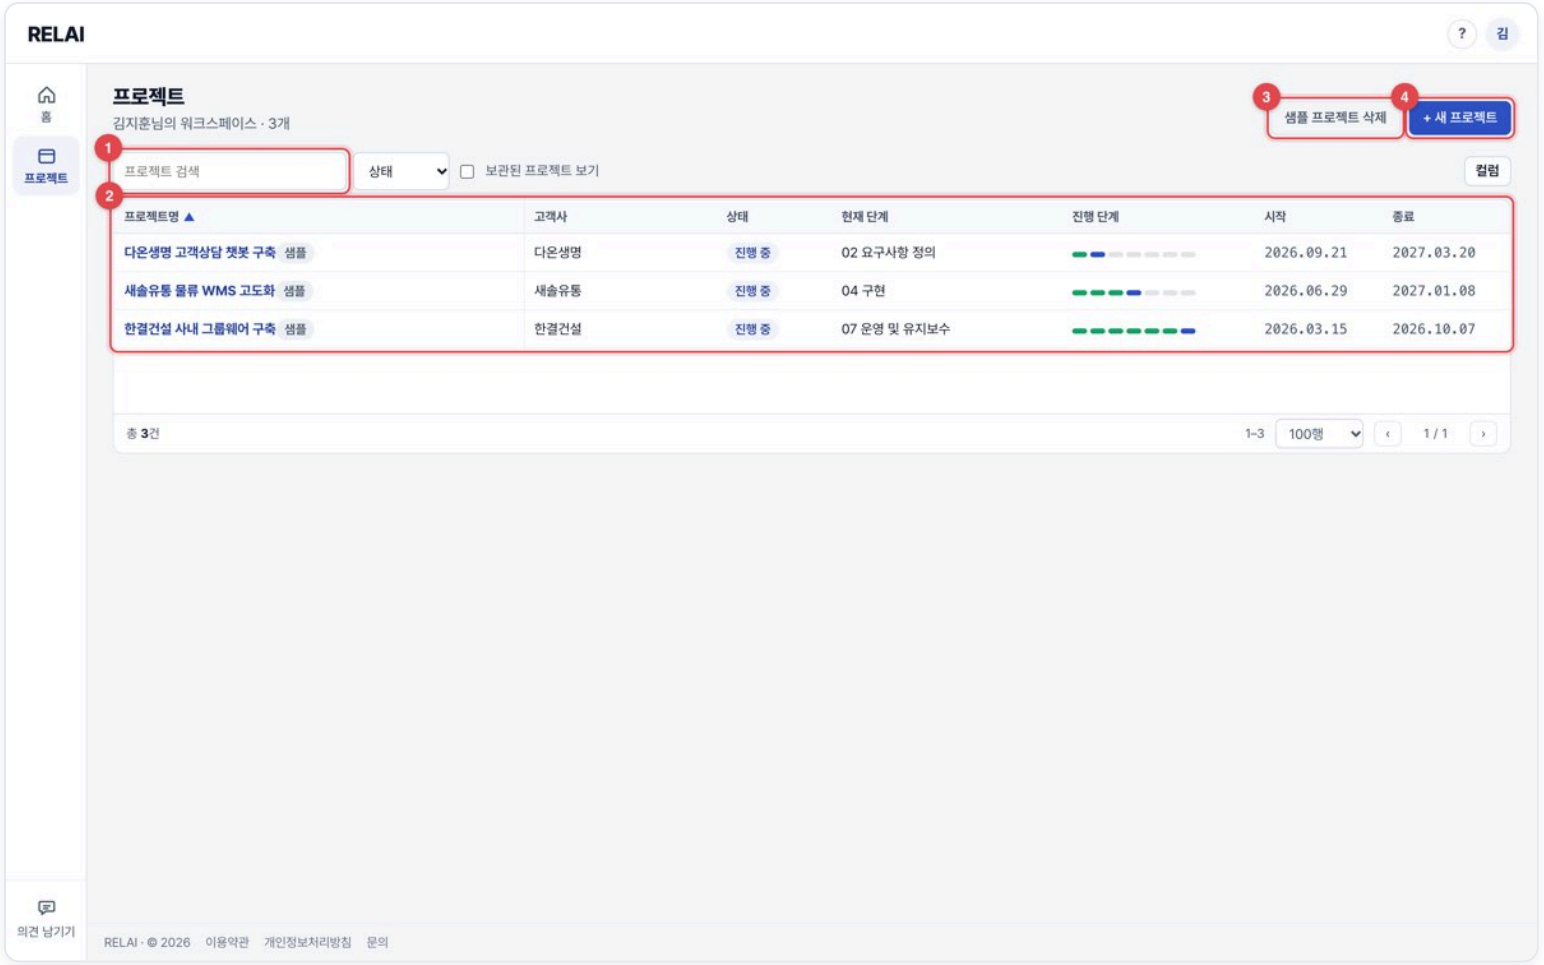

화면 번호 설명

1. 프로젝트 이름으로 검색하고, 상태(진행 중·완료·보관)로 거릅니다.
2. 목록 — 고객사, 현재 단계, 7단계 진행 막대, 시작·종료일을 한 줄에 봅니다. 이름을 누르면 프로젝트로 들어갑니다.
3. [샘플 프로젝트 삭제] — 연습이 끝나면 샘플 3개를 한 번에 지웁니다.
4. [+ 새 프로젝트]


무엇을	워크스페이스의 모든 프로젝트를 표로 봅니다.	**어떻게**	검색·상태 필터·정렬로 찾고, 이름을 눌러 들어갑니다.	**결과**	"샘플" 표시가 붙은 프로젝트는 사용량·요금에 포함되지 않습니다.

03. 프로젝트 만들기·샘플

기본 정보만 넣으면 프로젝트가 생기고, 나머지는 01 착수 단계에서 차례로 채웁니다.


새 프로젝트 만들기

기본 정보 입력

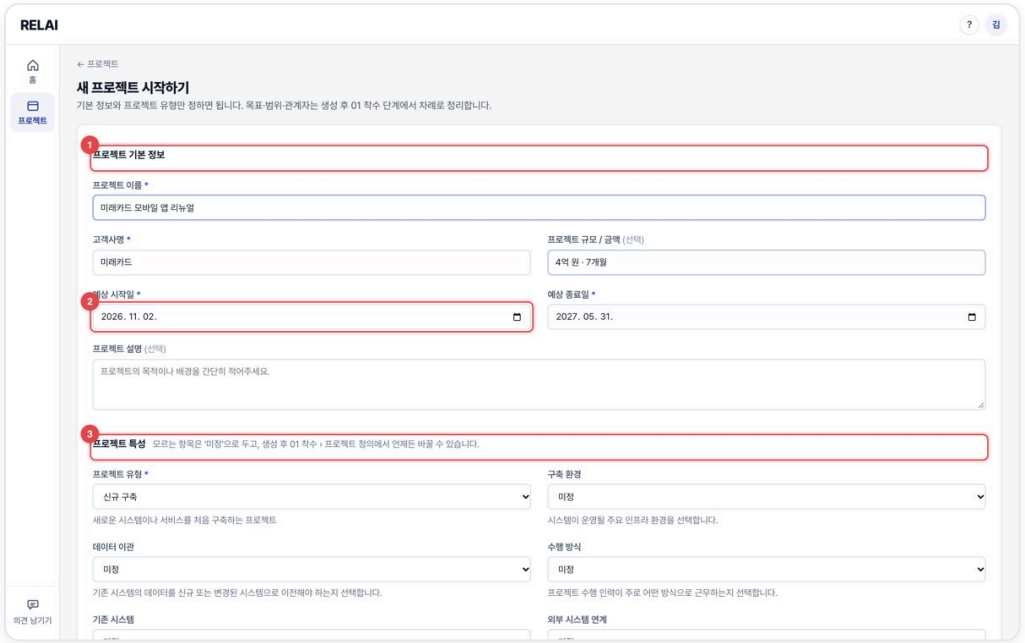

1. 프로젝트 기본 정보 — 프로젝트 이름, 고객사명(필수), 규모·금액(선택).
2. 예상 시작일·종료일(필수). 이 기간으로 마일스톤과 WBS 일정의 기준이 잡힙니다.
3. 프로젝트 특성 — 유형(신규 구축·고도화 등), 구축 환경, 데이터 이관, 수행 방식, 기존 시스템, 외부 연계. 모르면 "미정"으로 두고 나중에 바꿉니다.


프로젝트 특성 선택 후 시작

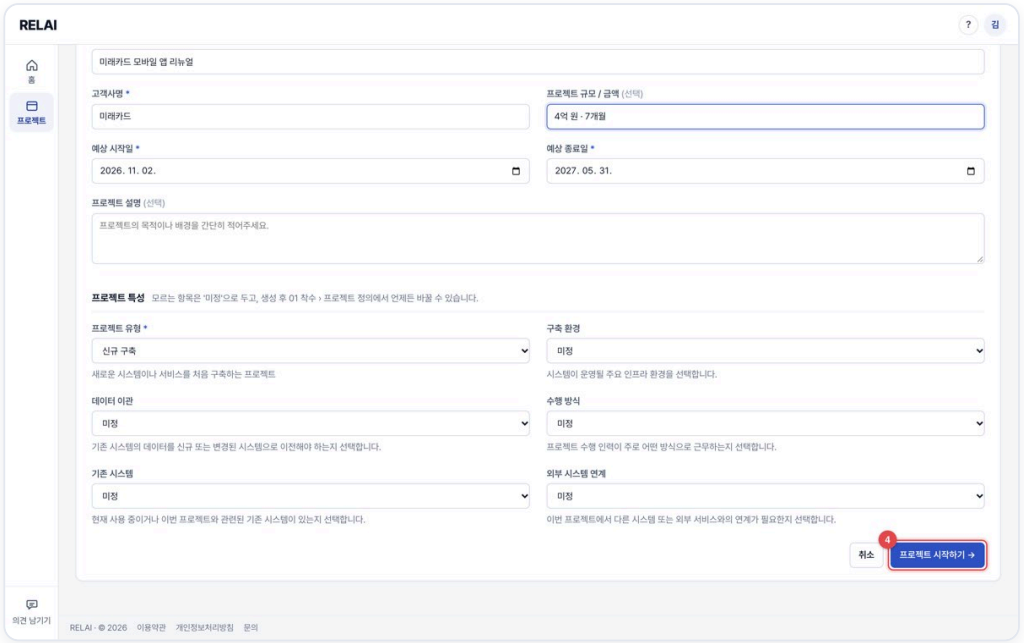

4. [프로젝트 시작하기 →]를 누르면 프로젝트가 생기고 "지금 할 일" 화면으로 이동합니다.

무엇을	내 프로젝트를 등록합니다.	어떻게	이름·고객사·기간·유형만 넣고 시작합니다.	결과	특성에 맞춰 7단계 업무 목록이 자동으로 준비됩니다. (PC에서만 만들 수 있습니다.)

샘플 프로젝트 3개

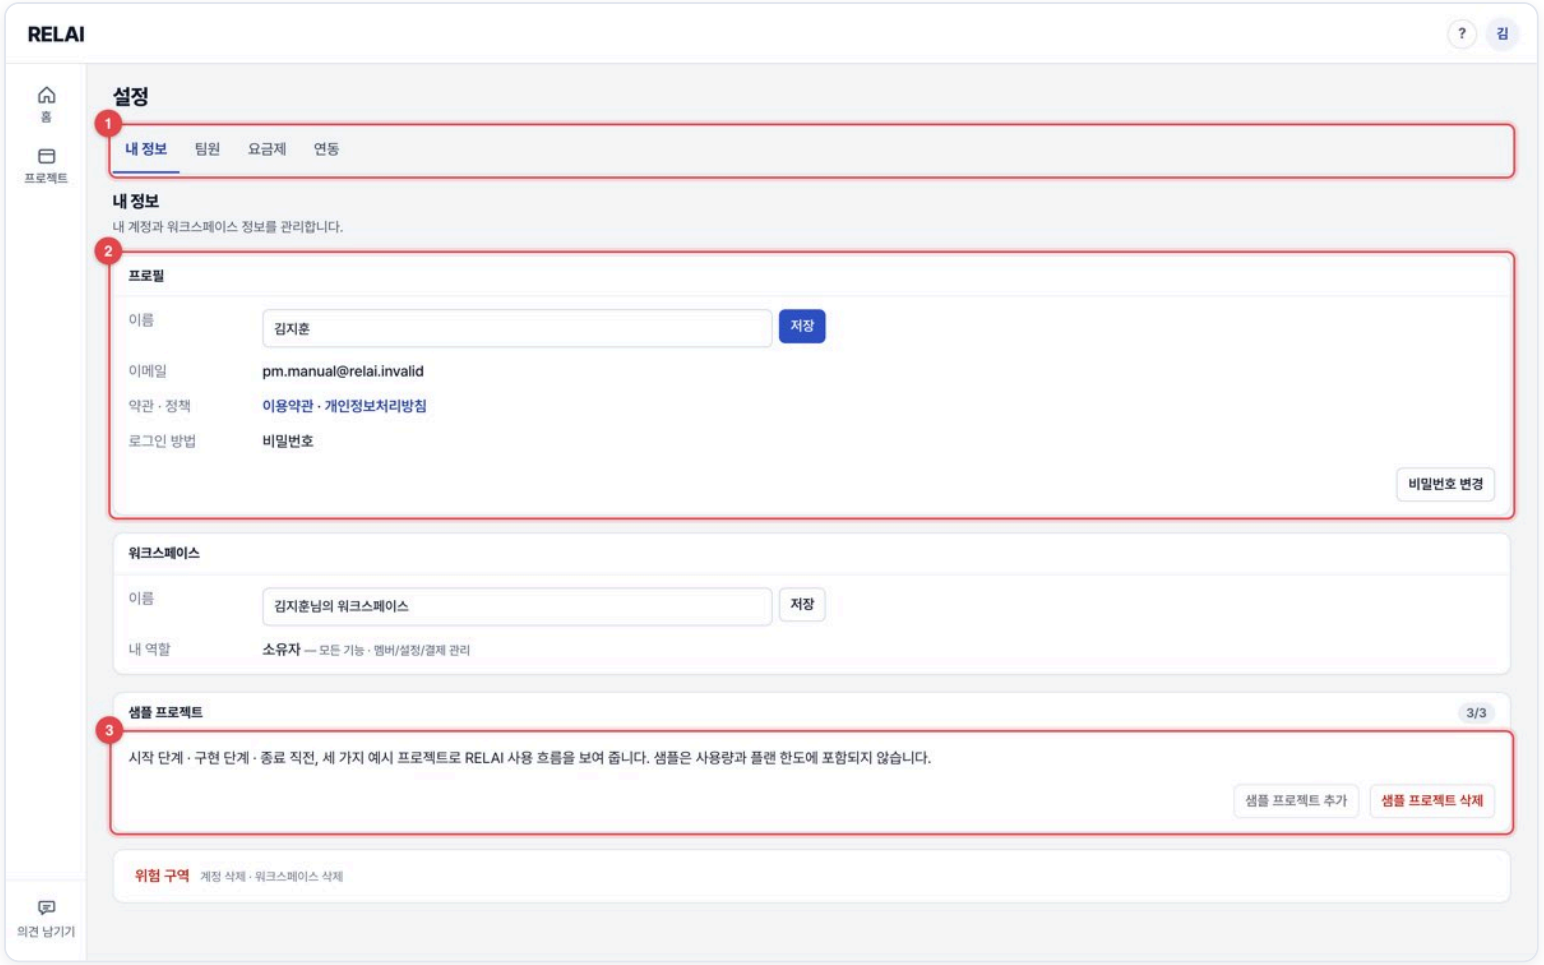

화면 번호 설명


1. 설정 탭 — 내 정보 · 팀원 · 요금제 · 연동
2. 프로필 — 이름, 이메일, 비밀번호 변경
3. 샘플 프로젝트 — 시작 단계(다온생명 챗봇), 구현 단계(새솔유통 WMS), 종료 직전(한결건설 그룹웨어). 지웠다가 다시 추가할 수 있습니다.

무엇을	단계가 다른 예시 프로젝트 3개로 RELAI를 먼저 익힙니다.	어떻게	가입하면 자동으로 들어옵니다. 설정 › 내 정보에서 추가·삭제합니다.	결과	빈 화면 대신 "다 채워진 모습"을 보고 내 프로젝트를 시작할 수 있습니다. 이 가이드의 화면도 모두 샘플 데이터입니다.

04. 7단계 흐름

01 착수 → 02 요구사항 정의 → 03 분석·설계 → 04 구현 → 05 시험 → 06 전환 및 오픈 → 07 운영 및 유지보수. 각 단계의 필수 업무를 마치면 다음 단계로 넘어갑니다.

지금 할 일 — 프로젝트의 첫 화면

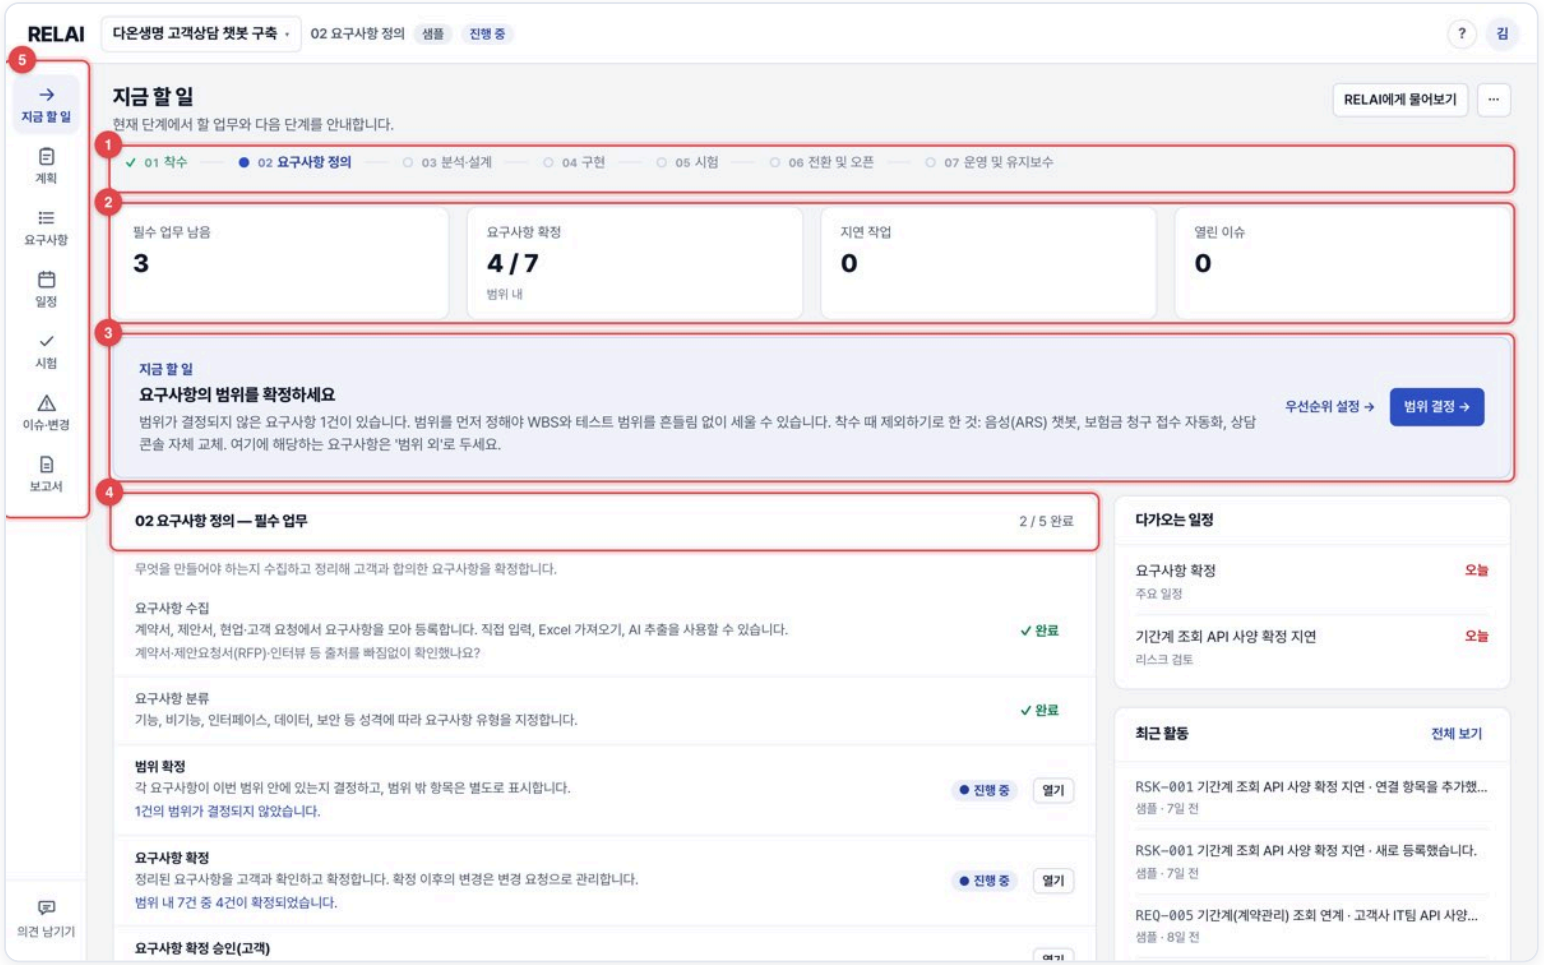


화면 번호 설명

1. 7단계 진행 표시 — ✓ 끝난 단계, ● 현재 단계, ○ 남은 단계. 누르면 그 단계의 업무를 봅니다.
2. 핵심 숫자 — 남은 필수 업무, 요구사항 확정 수, 지연 작업, 열린 이슈.
3. 지금 할 일 — 지금 가장 먼저 할 한 가지와 바로 가는 버튼.
4. 현재 단계의 필수 업무 목록 — 업무마다 설명, 완료 기준, 진행 상태, [열기].
5. 왼쪽 메뉴 — 지금 할 일 · 계획 · 요구사항 · 일정 · 시험 · 이슈·변경 · 보고서.

무엇을	이 프로젝트에서 지금 해야 할 일을 알려 줍니다.	어떻게	"지금 할 일" 카드의 버튼을 누르고, 끝나면 다음 업무로 넘어갑니다.	결과	필수 업무가 모두 끝나면 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.

프로젝트 개요 — 한 장으로 보는 프로젝트

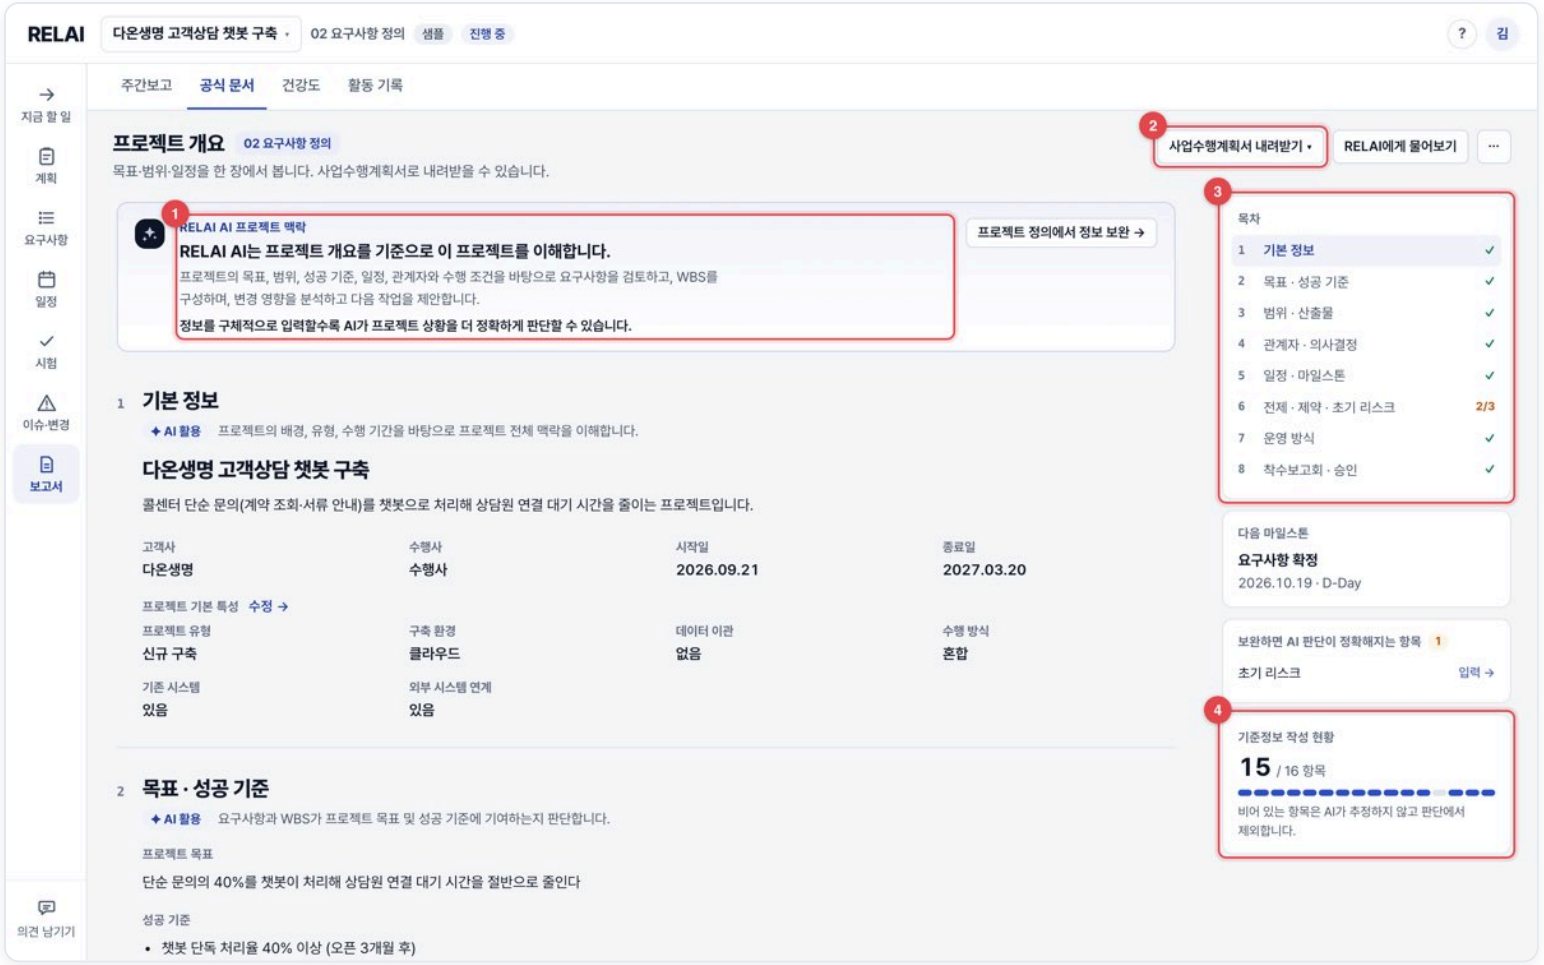


화면 번호 설명

1. RELAI AI 프로젝트 맥락 — AI 기능은 이 개요를 기준으로 프로젝트를 이해합니다. 많이 채울수록 AI 결과가 정확해집니다.
2. [사업수행계획서 내려받기] — 개요를 Word 문서로 받습니다.
3. 목차 — 기본 정보, 목표·성공 기준, 범위·산출물, 관계자, 일정·마일스톤, 전제·제약·초기 리스크, 운영 방식, 착수보고회·승인.
4. 기준정보 작성 현황 — 16개 항목 중 몇 개를 채웠는지.

무엇을	목표·범위·일정·관계자를 한 장에 모아 봅니다.	어떻게	보고서 › 공식 문서에서 열고, 비어 있는 항목은 [프로젝트 정의에서 정보 보완]으로 채웁니다.	결과	고객 보고용 사업수행계획서가 바로 만들어집니다.

프로젝트 정의 — 01 착수 단계의 입력 화면

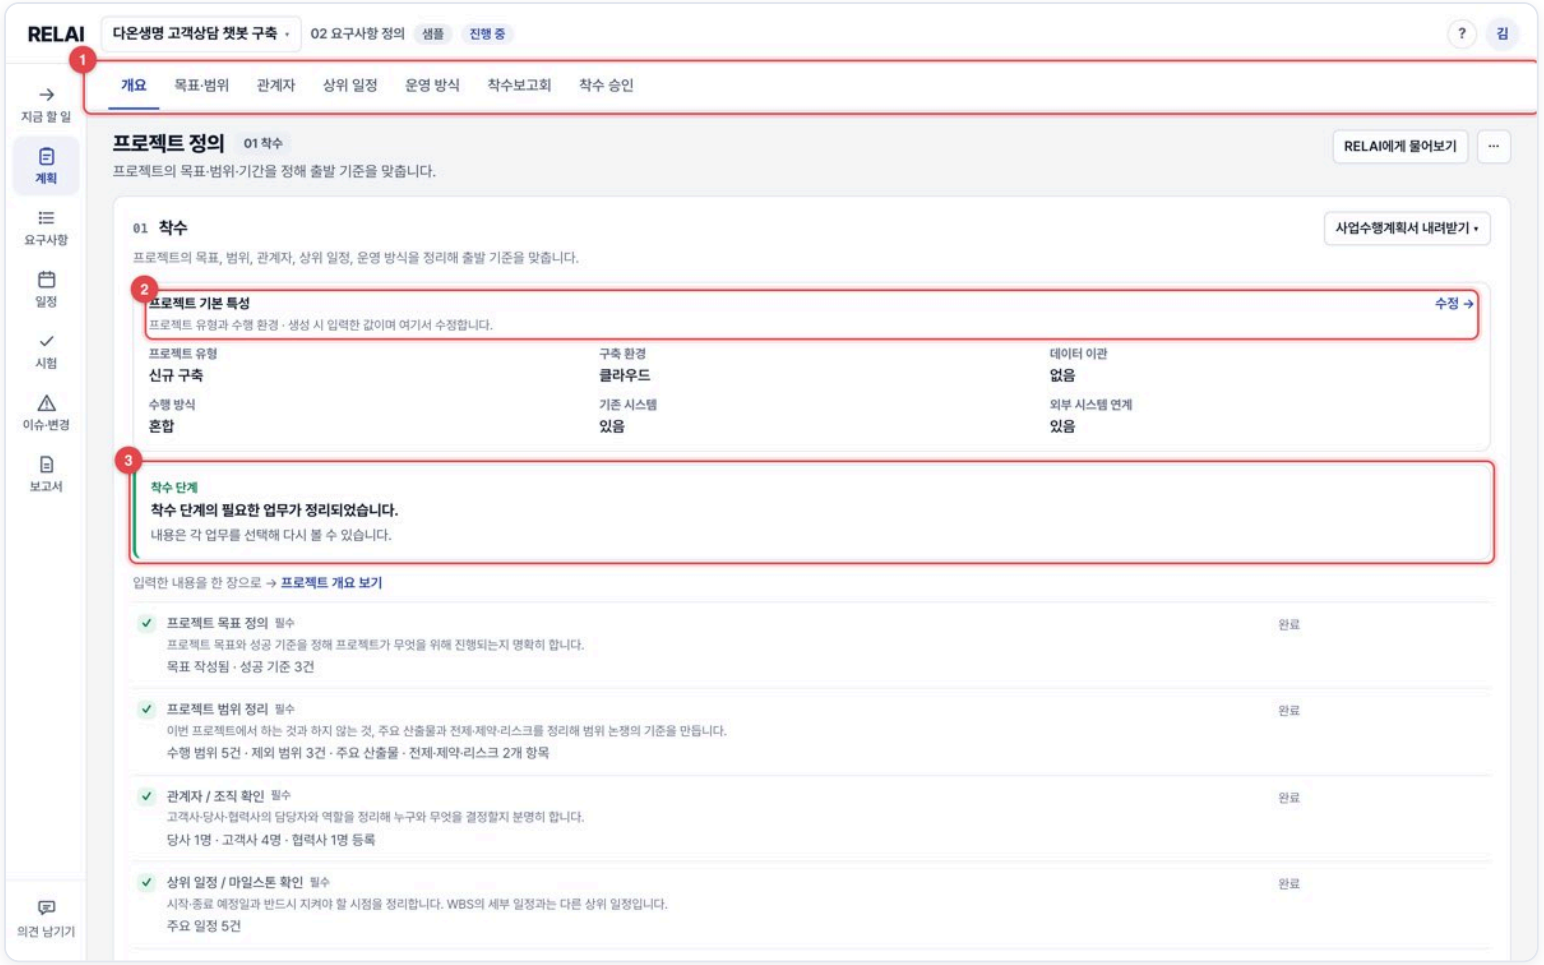


화면 번호 설명

1. 탭 — 개요 · 목표·범위 · 관계자 · 상위 일정 · 운영 방식 · 착수보고회 · 착수 승인. 탭 하나가 업무 하나입니다.
2. 프로젝트 기본 특성 — 만들 때 고른 유형·환경을 여기서 수정합니다.
3. 착수 단계 정리 상태 — 필요한 업무가 다 끝났는지 알려 줍니다. 아래에 업무별 완료 여부가 이어집니다.

무엇을	프로젝트의 출발 기준(목표, 범위, 관계자, 일정)을 정합니다.	어떻게	탭을 왼쪽부터 순서대로 채우고 각 탭의 [다음 업무 →]로 넘어갑니다.	결과	입력한 내용이 프로젝트 개요와 사업수행계획서에 그대로 모입니다.

상위 일정 / 마일스톤

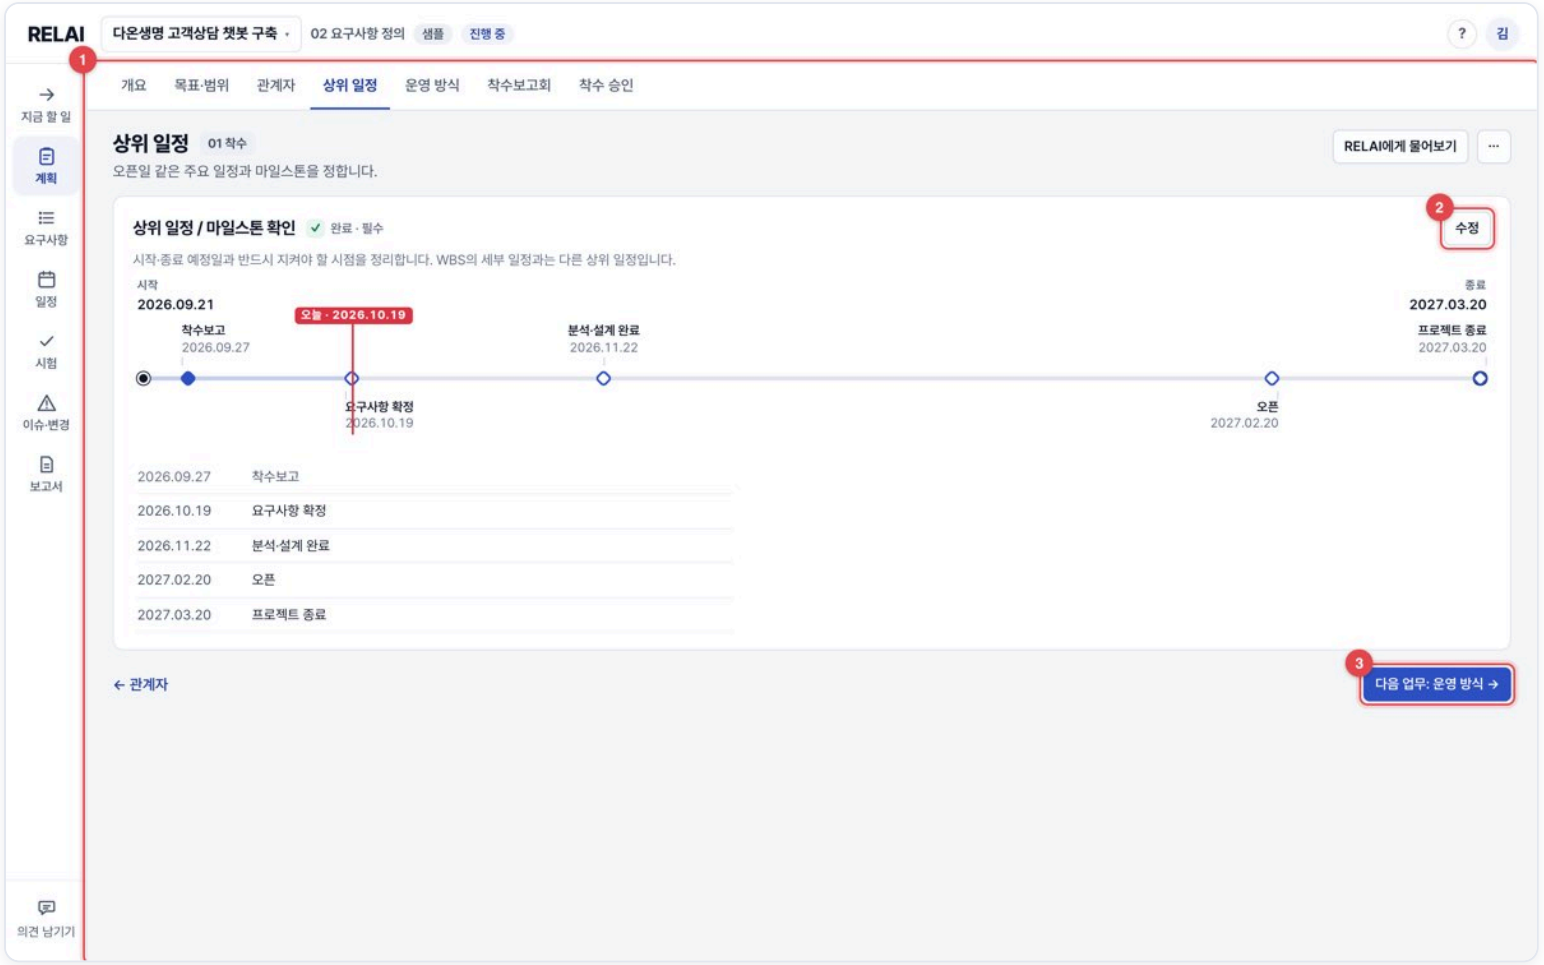


화면 번호 설명

1. 타임라인 — 시작일부터 종료일까지 마일스톤(착수보고, 요구사항 확정, 분석·설계 완료, 오픈, 프로젝트 종료)과 오늘 위치를 봅니다.
2. [수정] — 마일스톤 이름과 날짜를 바꿉니다.
3. [다음 업무: 운영 방식 →]

무엇을	고객과 약속한 큰 날짜(마일스톤)를 정합니다.	**어떻게**	5개 안팎이면 충분합니다. 세부 작업 일정은 WBS에서 따로 짭니다.	**결과**	홈의 "다가오는 일정"과 WBS 간트에 표시되고, 밀릴 것 같으면 리스크로 먼저 알려 줍니다.


간트 차트 — 작업과 마일스톤을 일정표로

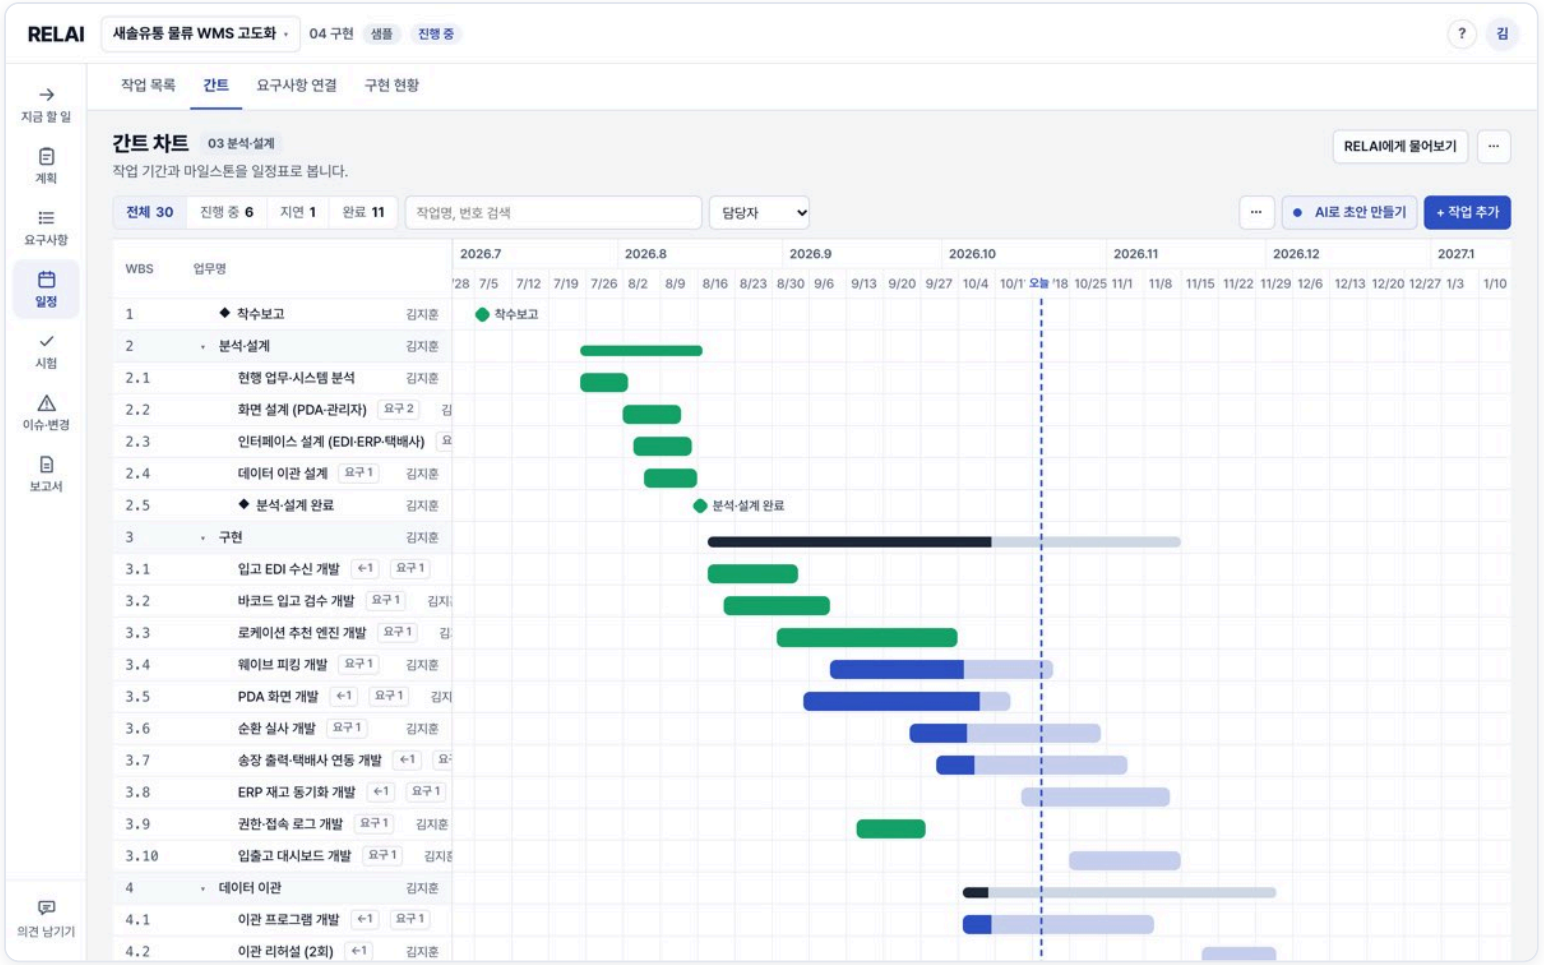


무엇을	WBS 작업의 시작·종료일과 마일스톤을 막대 그래프로 봅니다.
어떻게	일정 › 간트 탭. 파란 점선이 오늘, ◆가 마일스톤, 진한 부분이 실제 진척입니다.
결과	늦어지는 작업과 마일스톤 사이의 여유를 눈으로 확인합니다.

착수보고회와 착수 승인

착수보고회

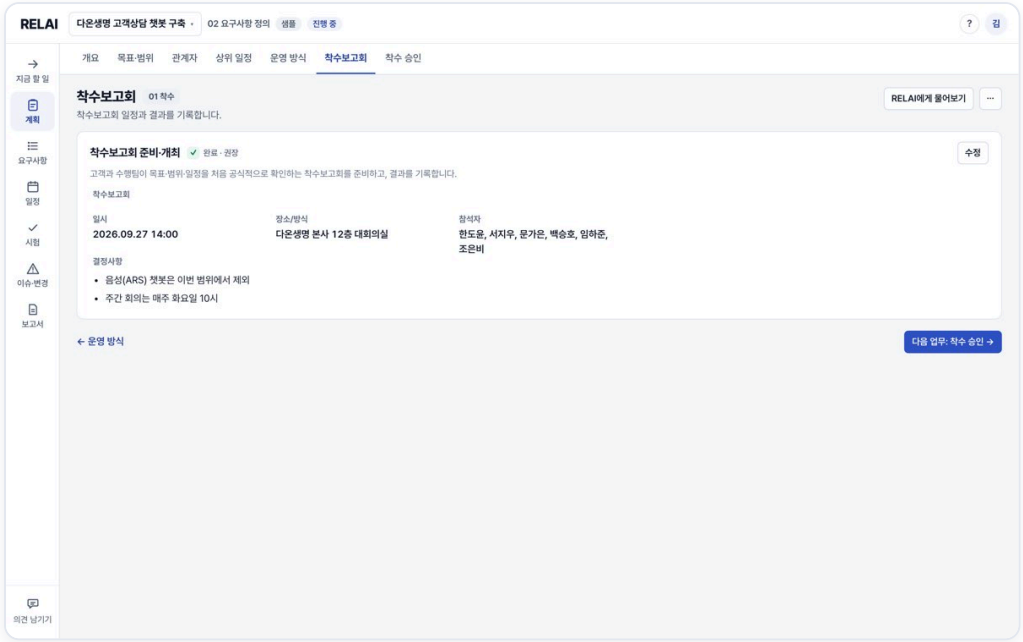


착수 결과 승인(고객·스폰서)

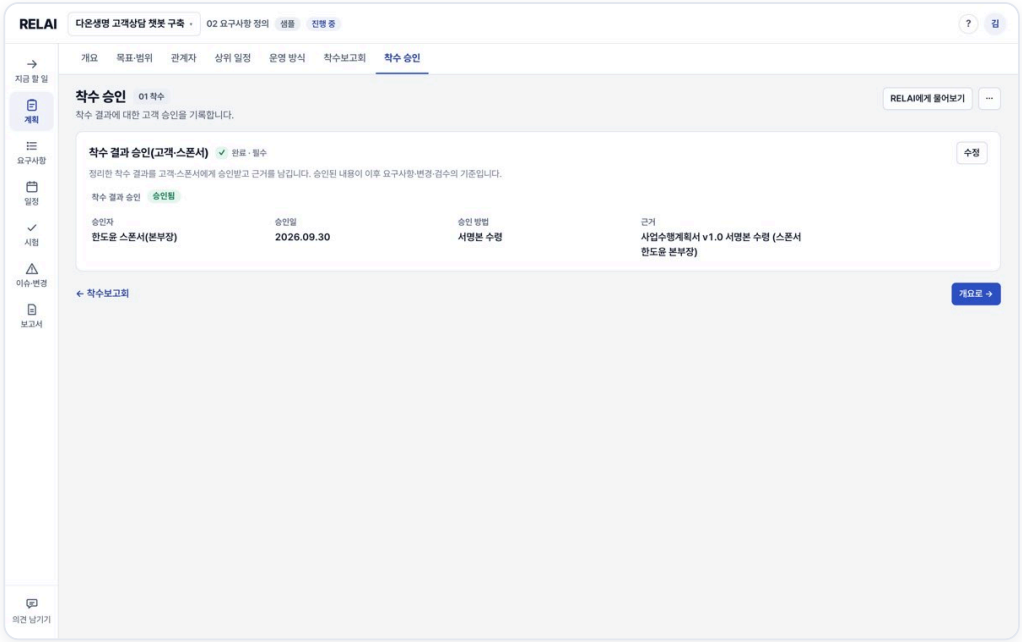

무엇을	착수보고회 일시·참석자·결정사항과 고객 승인을 기록합니다.	**어떻게**	각 탭의 [수정]으로 입력합니다. 승인은 승인자·승인일·방법·근거를 남깁니다.	**결과**	승인된 내용이 이후 요구사항·변경·검수의 기준이 되고, 01 착수 단계가 마무리됩니다.

요구사항 목록

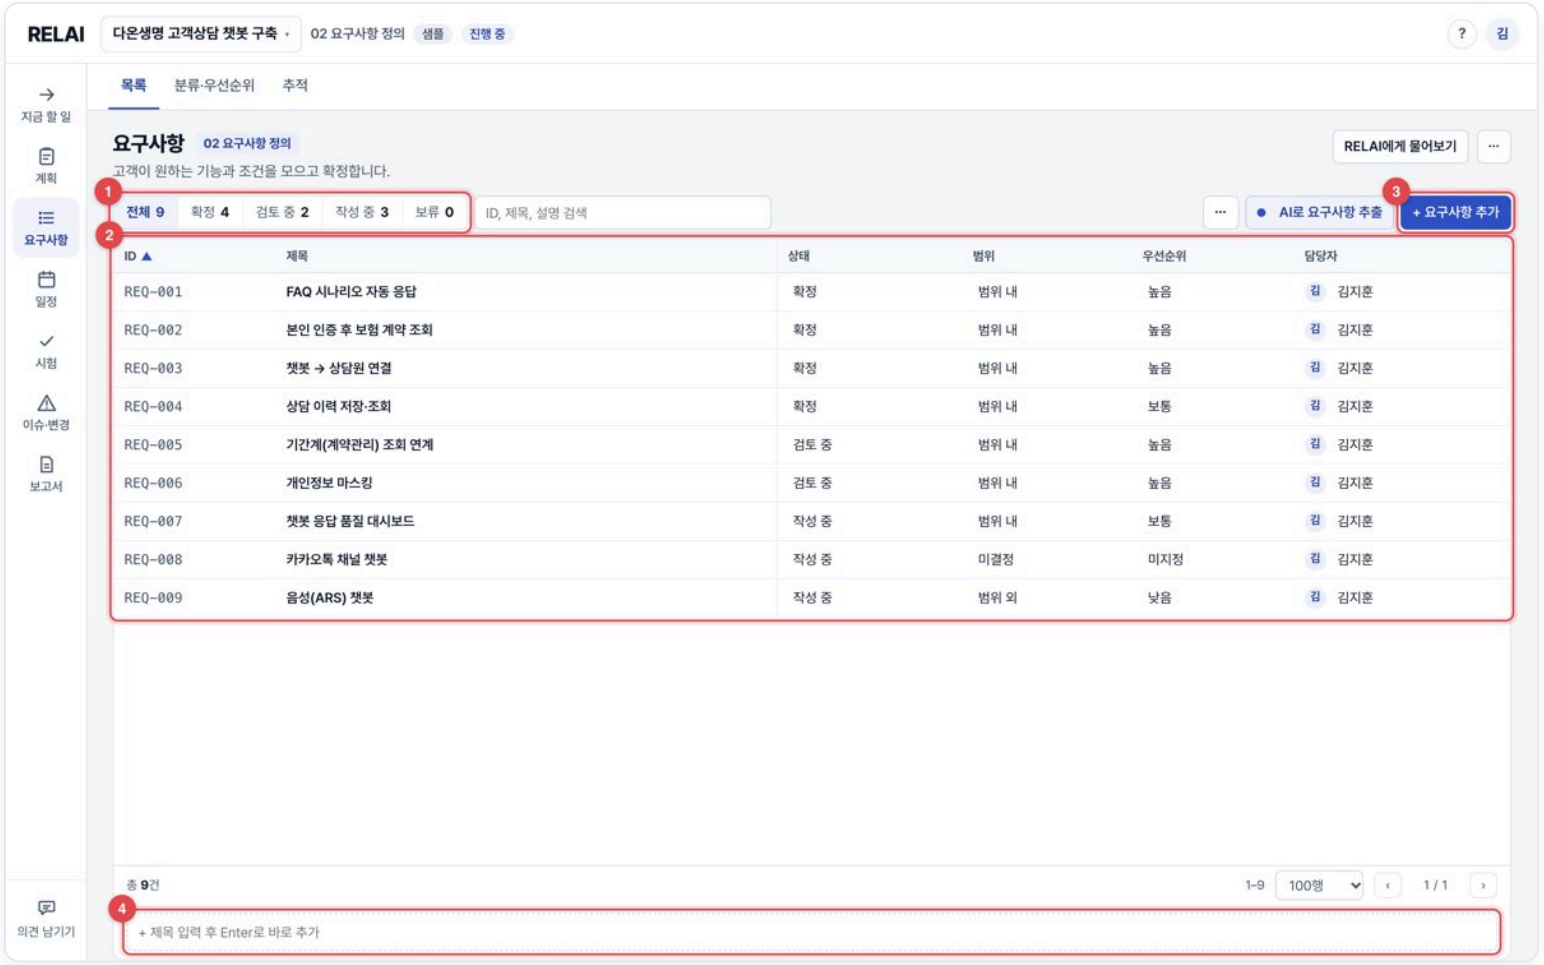


화면 번호 설명

1. 상태별 개수 — 전체 · 확정 · 검토 중 · 작성 중 · 보류. 누르면 그 상태만 봅니다.
2. 목록 — 상태·범위·우선순위·담당자를 칸에서 바로 바꿉니다.
3. [+ 요구사항 추가] — 왼쪽의 [AI로 요구사항 추출]은 5장에서 설명합니다.
4. 빠른 추가 — 제목만 입력하고 Enter.


무엇을	고객이 원하는 기능과 조건을 모으고 확정합니다.	어떻게	직접 입력, Excel 가져오기(⋯ 메뉴), AI 추출 중 편한 방법으로 등록합니다.	결과	확정된 요구사항이 WBS·테스트·변경 요청과 연결되는 기준이 됩니다.

요구사항 상세와 추적

상세 패널

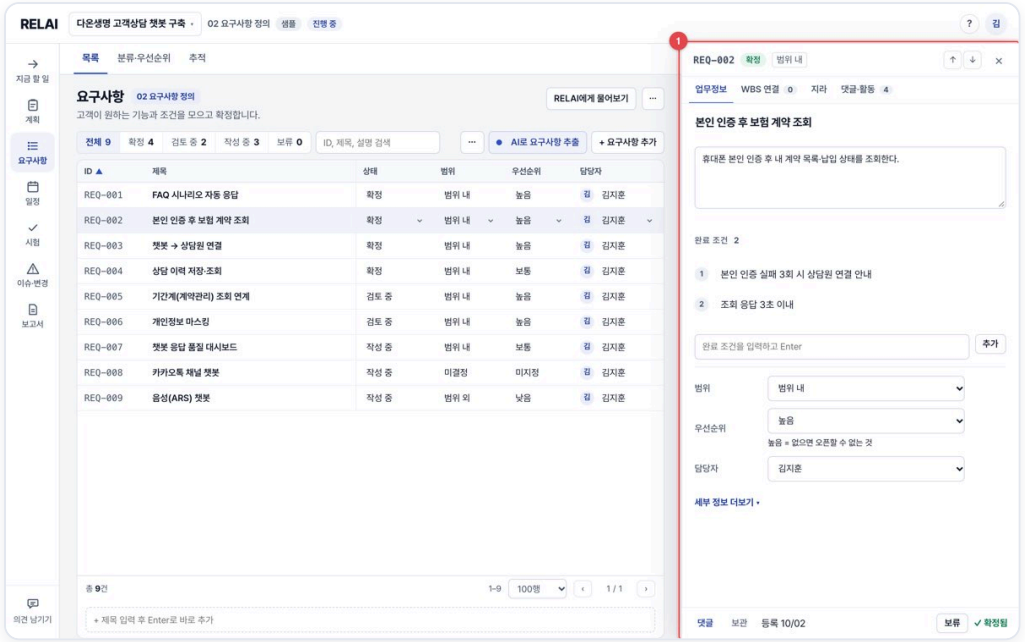


요구사항 추적

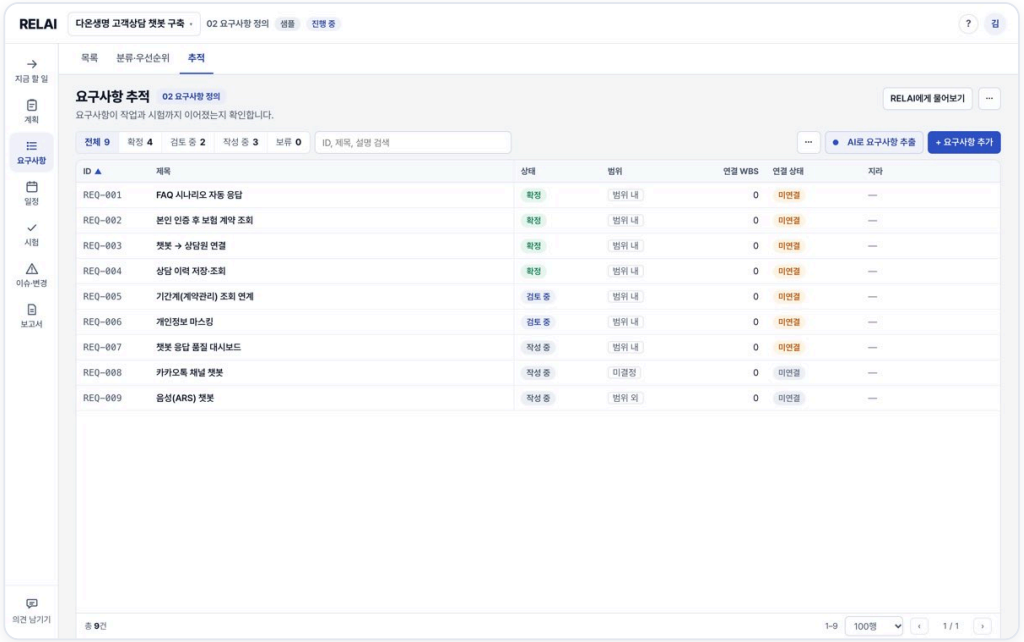

1 ID를 누르면 오른쪽에 상세 패널이 열립니다 — 설명, 완료 조건, 범위, 우선순위, 담당자, WBS 연결, 댓글·활동.

무엇을	요구사항 하나를 자세히 다루고, 작업·시험까지 이어졌는지 확인합니다.	어떻게	추적 탭에서 요구사항마다 연결된 WBS 수와 "미연결"을 봅니다.	결과	빠진 작업 없이 범위 안의 요구사항이 모두 개발·시험으로 이어집니다.

WBS — 작업 목록

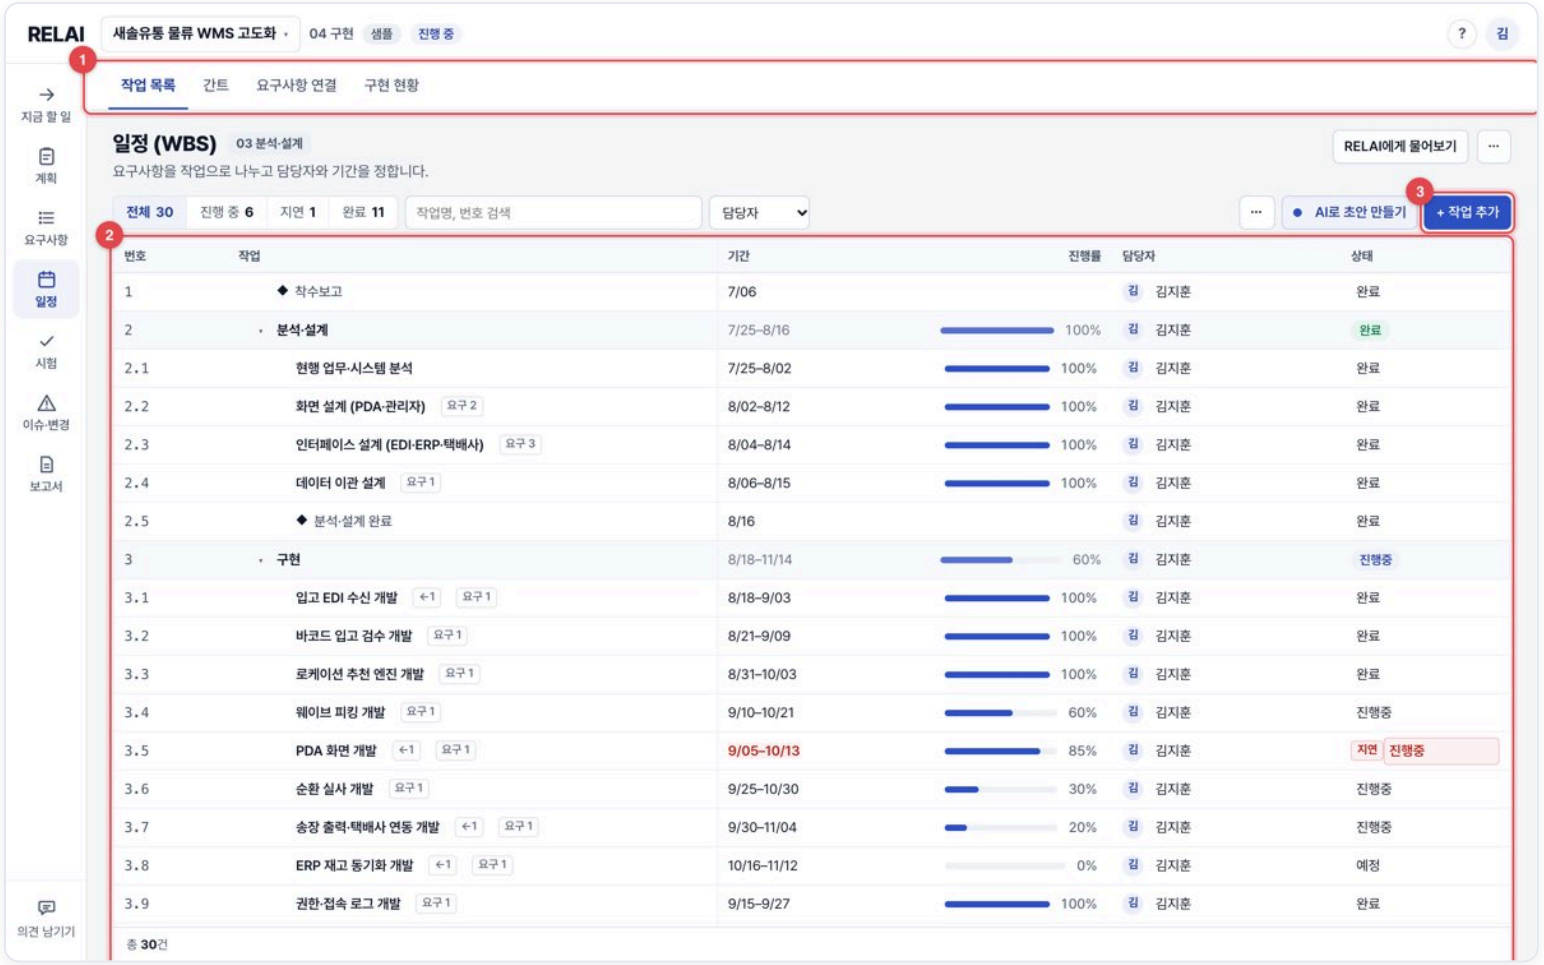


화면 번호 설명

1. 탭 — 작업 목록 · 간트 · 요구사항 연결 · 구현 현황.
2. 작업 목록 — 번호(1, 2.1 …), 기간, 진척률 막대, 담당자, 상태. 지연 작업은 빨간색으로 표시됩니다. "요구 1" 표시는 연결된 요구사항 수입니다.
3. [+ 작업 추가] — 옆의 [AI로 초안 만들기]는 5장에서 설명합니다.

무엇을	요구사항을 작업으로 나누고 담당자와 기간을 정합니다.	어떻게	확정 요구사항으로 [WBS 뼈대 만들기], 직접 추가, Excel 가져오기, AI 초안 중 선택합니다.	결과	진척률이 모여 프로젝트 건강도와 주간보고에 자동으로 반영됩니다.

이슈

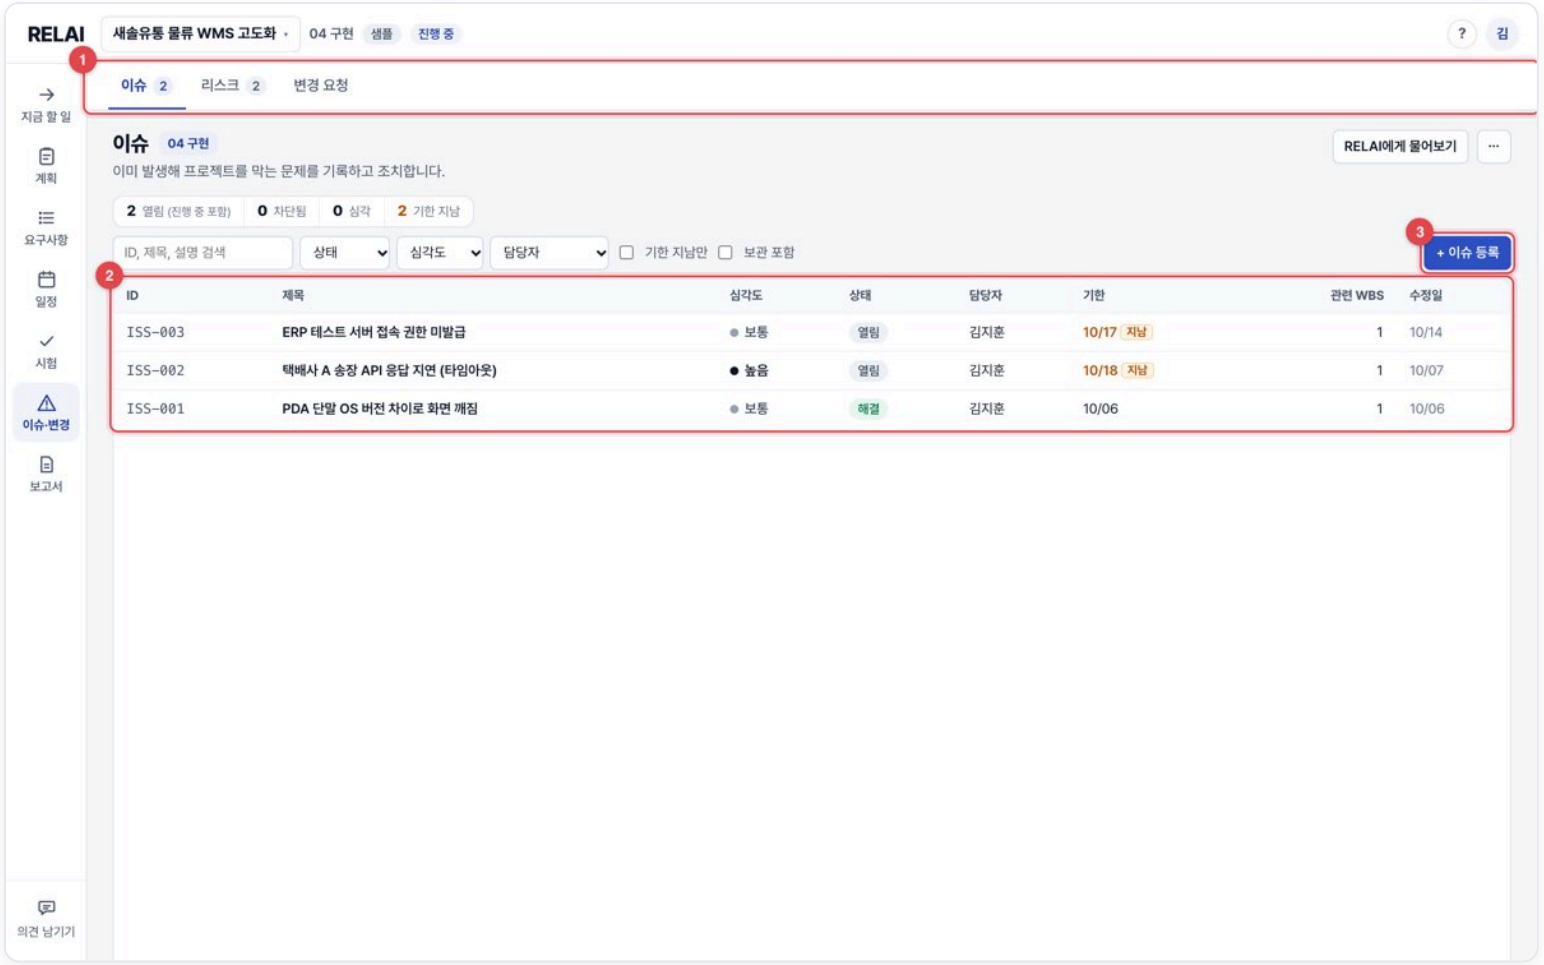


화면 번호 설명

1. 탭 — 이슈 · 리스크 · 변경 요청. 숫자는 열린 건수입니다.
2. 목록 — 심각도, 상태, 담당자, 기한(지나면 "지남"), 관련 WBS.
3. [+ 이슈 등록]


무엇을	이미 생겨서 진행을 막는 문제(이슈)를 기록하고 처리합니다.	어떻게	등록할 때 담당자와 기한을 정하고, 해결되면 [해결 처리]합니다.	결과	기한 지난 이슈는 "지금 할 일"과 건강도에 바로 올라옵니다.

이슈 상세와 리스크

이슈 상세 패널

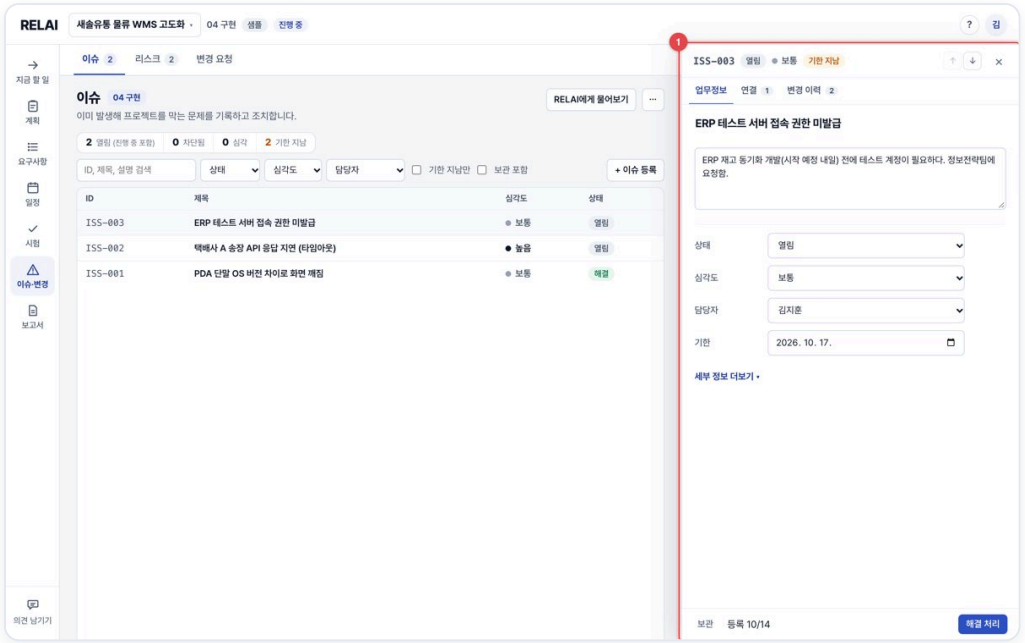

리스크 목록

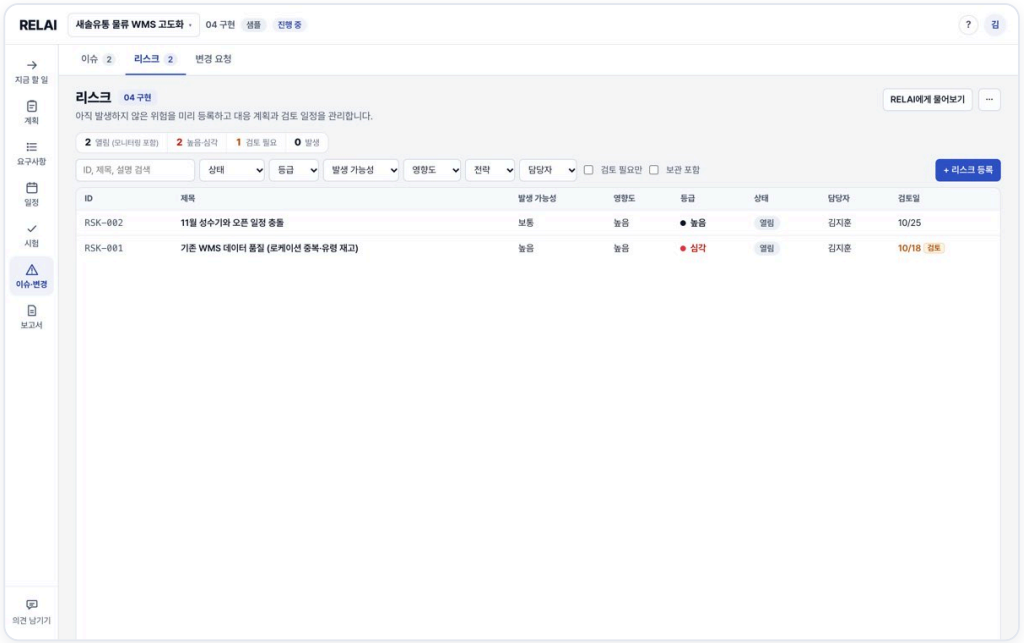


1 이슈 상세 — 설명, 상태, 심각도, 담당자, 기한, 연결(요구사항·WBS), 변경 이력. 아래 [해결 처리].

무엇을	리스크는 아직 생기지 않은 위험입니다. 발생 가능성 × 영향도로 등급이 정해집니다.	어떻게	대응 전략과 검토일을 정하고, 실제로 생기면 이슈로 바꿉니다.	결과	심각·높음 리스크는 프로젝트 건강도와 주간보고의 "확인 필요"에 표시됩니다.


변경 요청

변경 요청 목록

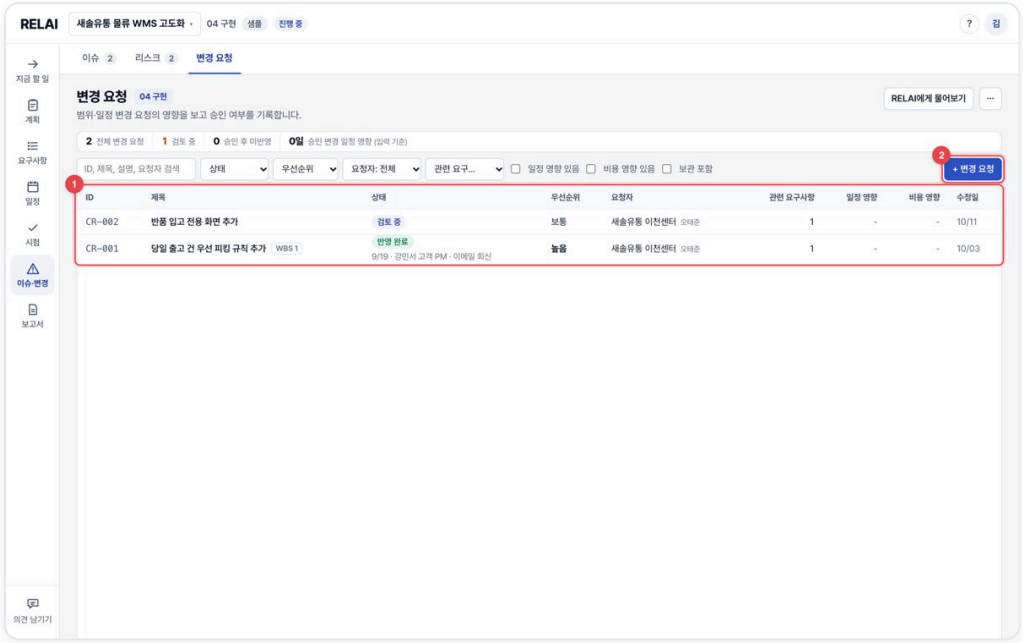

1. 목록 — 상태(검토 중·승인·반영 완료), 우선순위, 요청자, 관련 요구사항, 일정·비용 영향.
2. [+ 변경 요청]


변경 요청 상세

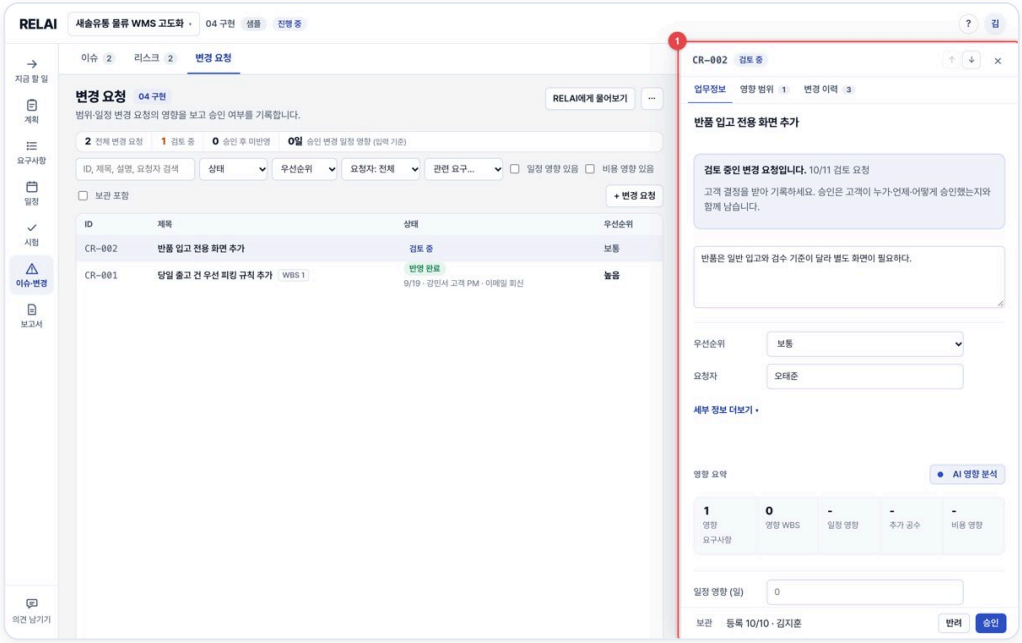

1. 상세 — 요청 내용, 영향 범위(요구사항·WBS), 영향 요약, 일정 영향(일). 아래에서 고객 결정을 [승인] 또는 [반려]로 기록합니다.

무엇을	확정 이후에 들어온 범위·일정 변경을 관리합니다.	**어떻게**	등록 → 영향 확인([AI 영향 분석] 가능) → 고객 승인 기록 → 반영 완료.	**결과**	누가·언제·어떻게 승인했는지 근거가 남아 범위 분쟁을 막습니다.

테스트

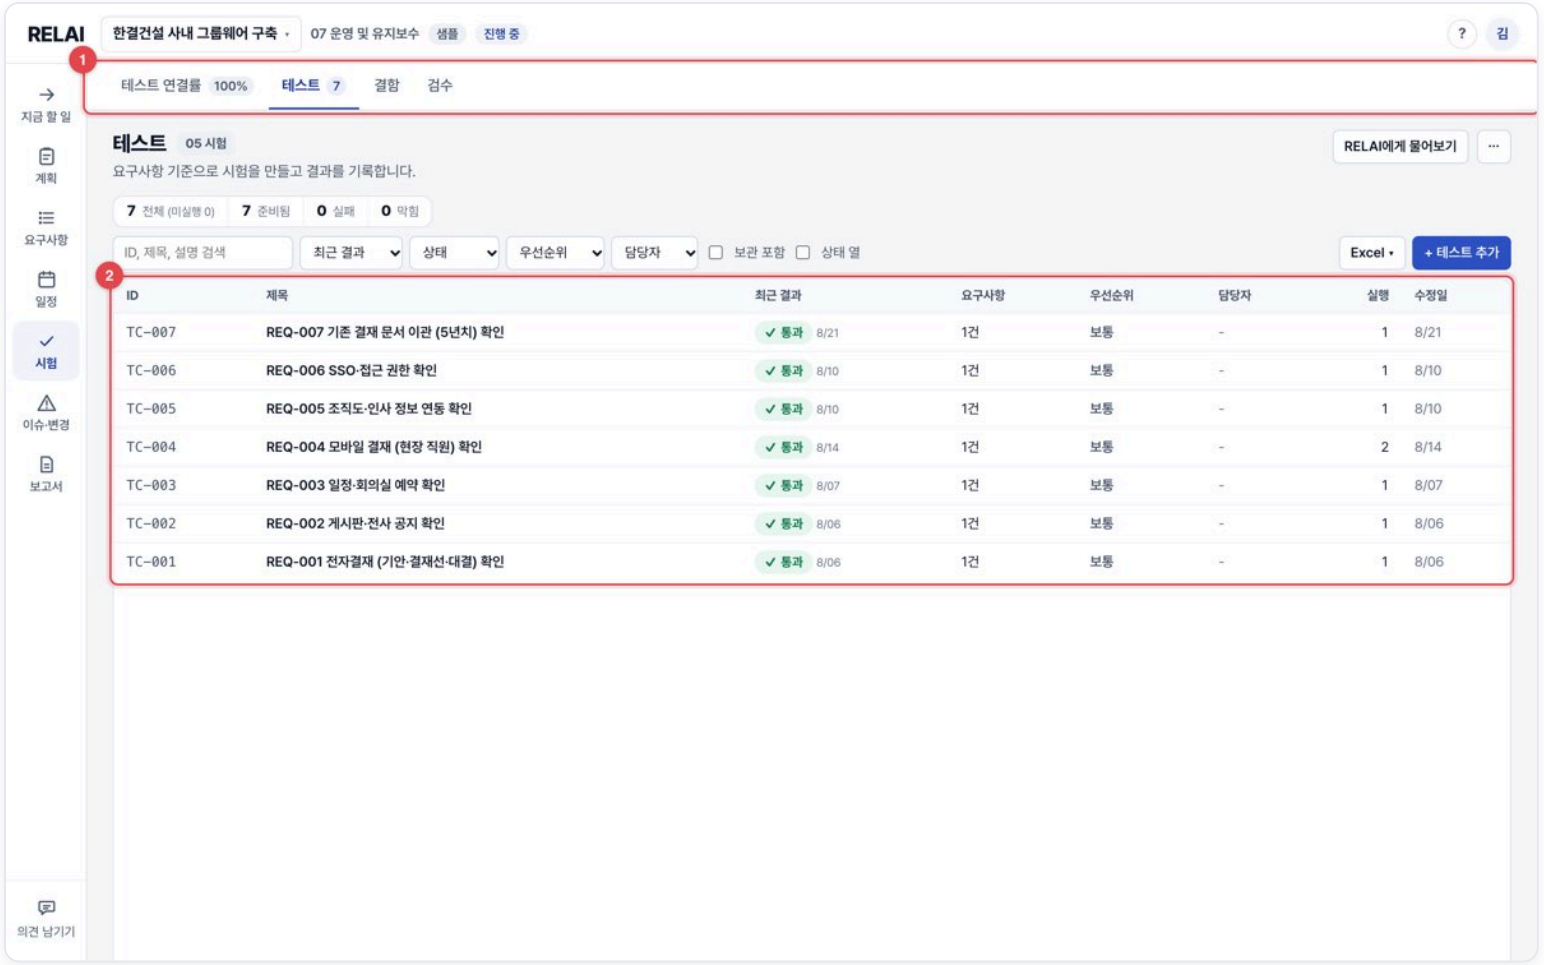


화면 번호 설명

1. 탭 — 테스트 연결률 · 테스트 · 결함 · 검수.
2. 테스트 목록 — 요구사항별 테스트, 최근 결과(통과·실패), 실행 횟수.


무엇을	요구사항 기준으로 테스트를 만들고 결과를 기록합니다.	어떻게	[요구사항별 테스트 만들기]로 범위 내 요구사항마다 1건씩 자동 생성합니다.	결과	실패한 테스트는 결함 탭에 모이고, 연결률로 빠진 시험을 찾습니다.

테스트 연결률과 검수(인수 승인)

테스트 연결률

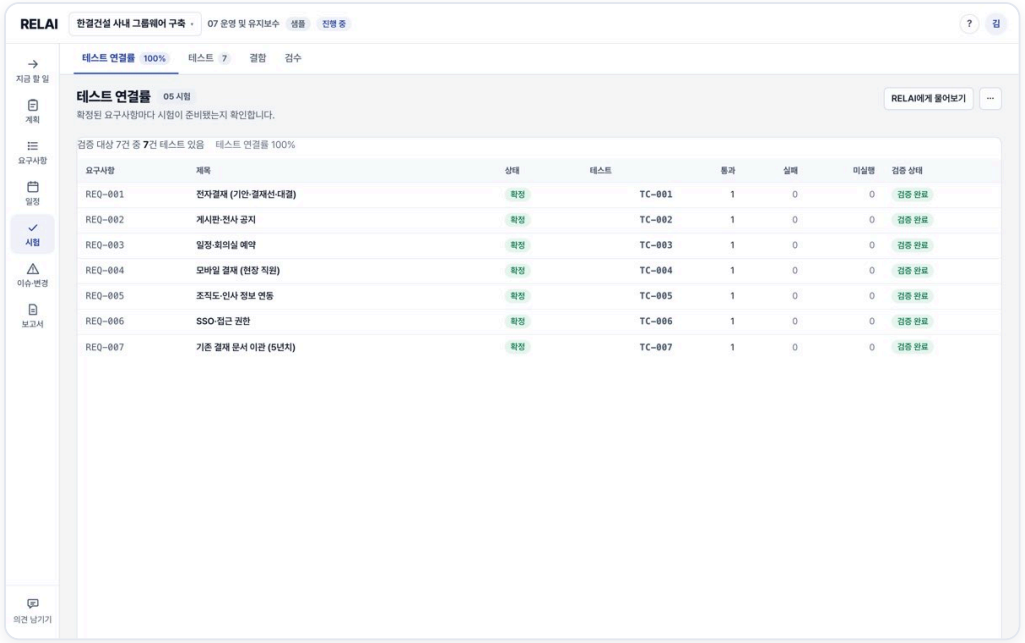


검수 상세

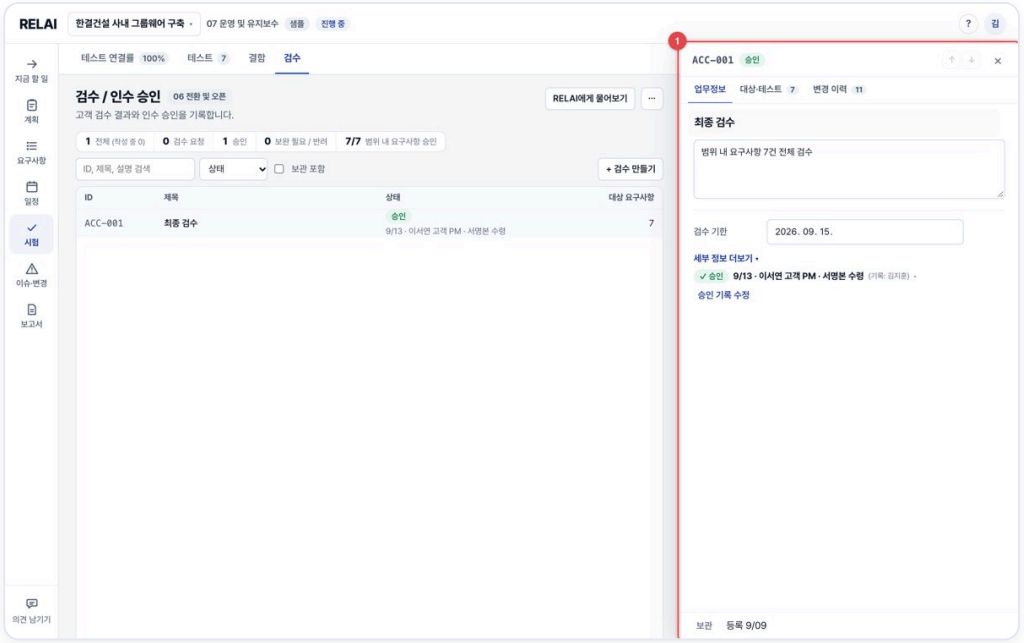

1 검수 상세 — 대상 요구사항·테스트, 검수 기한, 고객 승인 기록(승인자·방법).

무엇을	모든 요구사항에 테스트가 있는지 보고, 고객 검수(인수 테스트)를 진행합니다.	어떻게	[+ 검수 만들기]로 대상 요구사항을 묶어 고객에게 요청하고 결과를 기록합니다.	결과	"범위 내 요구사항 승인 7/7"처럼 오픈 전 확인이 끝났는지 한눈에 봅니다.

주간보고

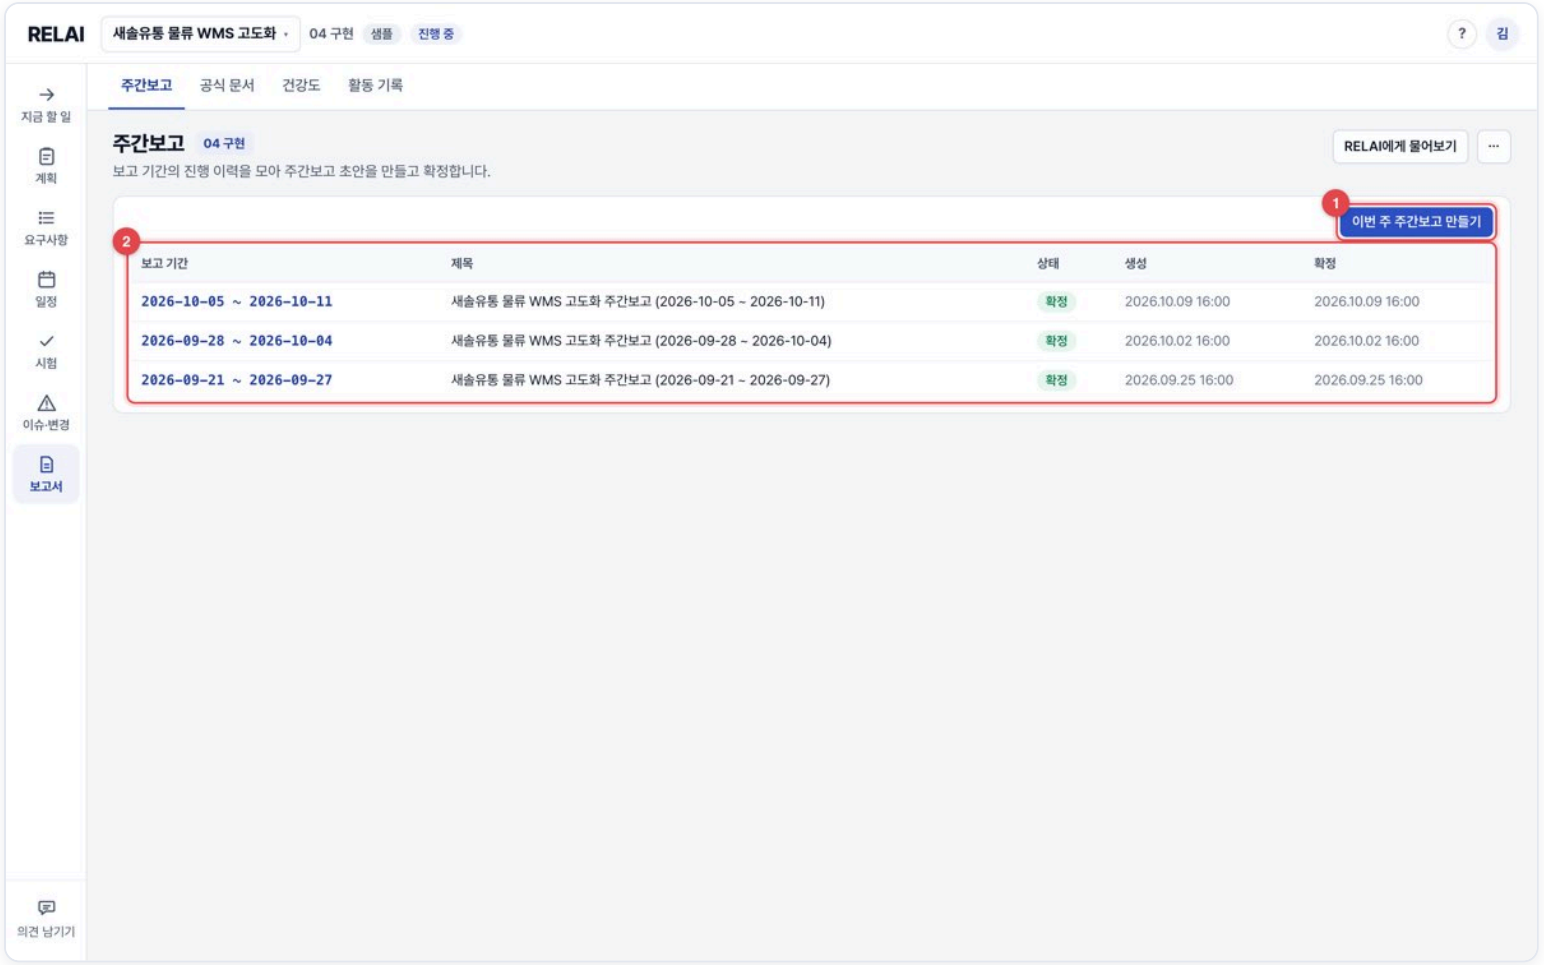


화면 번호 설명

1. [이번 주 주간보고 만들기] — 이번 주 진행 이력을 모아 초안을 만듭니다.
2. 보고서 목록 — 보고 기간, 상태(확정), 생성·확정 일시.

무엇을	주간보고를 직접 쓰지 않고 자동 초안으로 만듭니다.	어떻게	초안을 확인·편집한 뒤 확정하고 Word·PDF로 내려받거나 복사합니다.	결과	매주 같은 형식의 보고서가 쌓입니다.


주간보고 문서

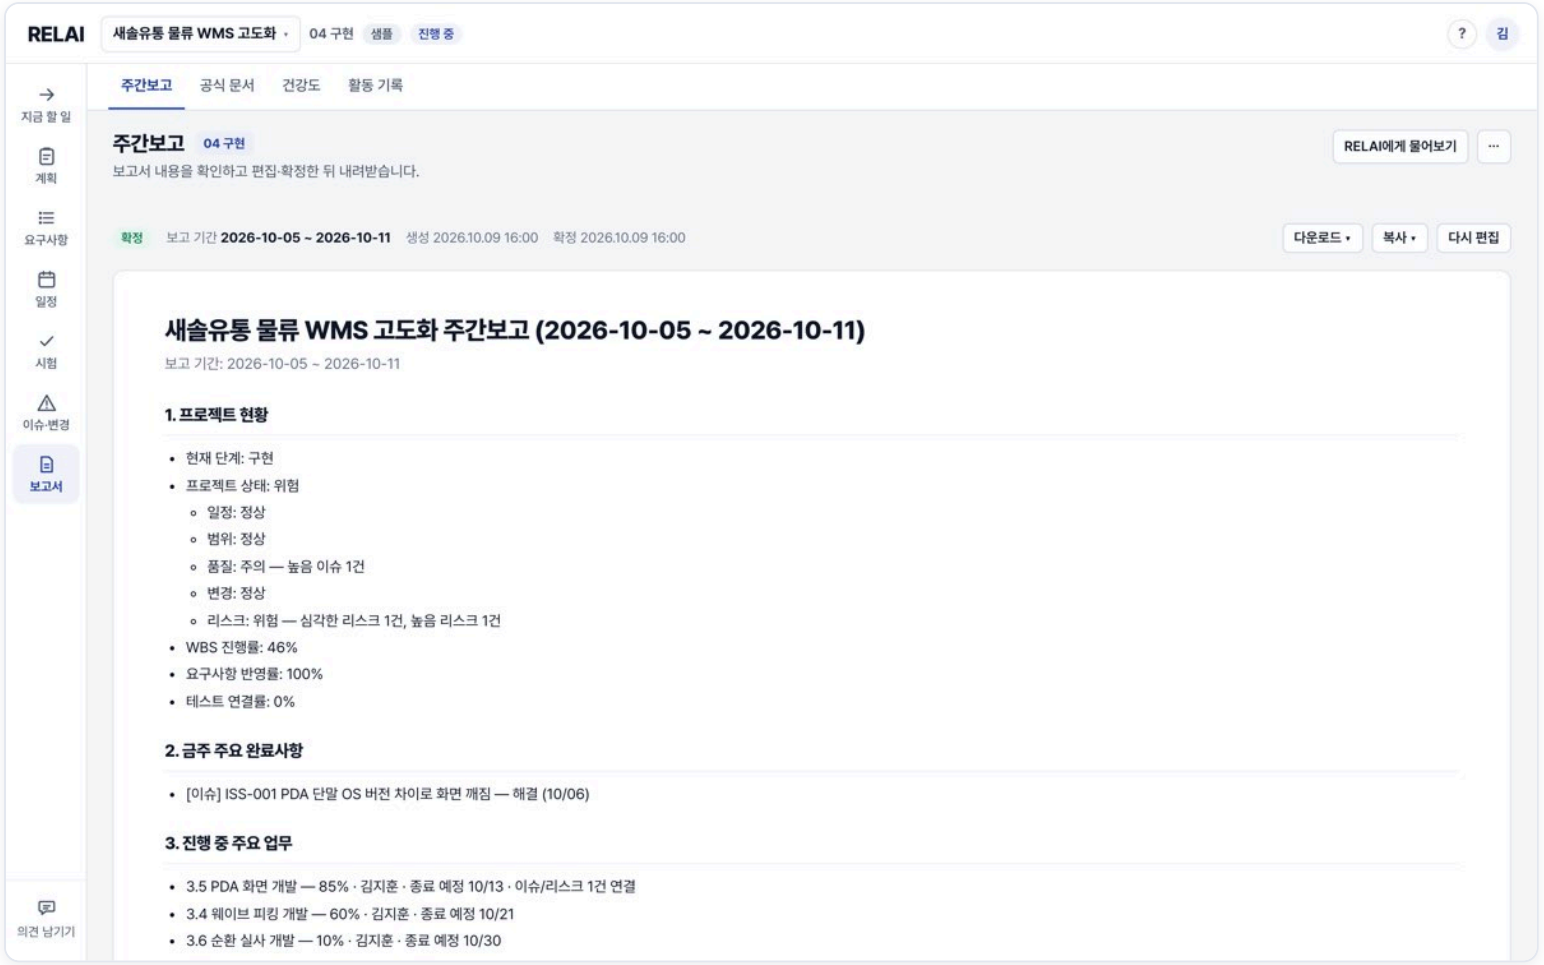

무엇을	프로젝트 현황, 금주 완료, 진행 중 업무, 이슈·리스크, 다음 주 계획이 들어갑니다.
어떻게	[다운로드]·[복사]·[다시 편집] 버튼을 씁니다.
결과	WBS 진척률과 이슈 상태가 그대로 반영되어 숫자를 따로 맞출 필요가 없습니다.

완료보고서

보고서 목록(종료 직전 프로젝트)

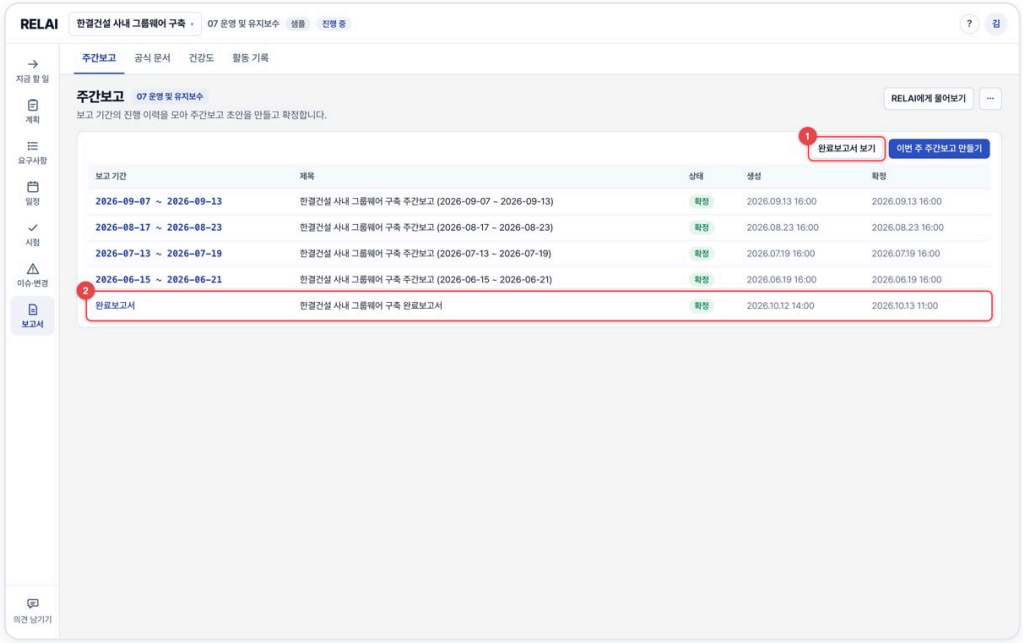


완료보고서



1. [완료보고서 보기]
2. 완료보고서 — 주간보고 목록에 함께 보관됩니다.


무엇을	프로젝트를 마칠 때 개요·범위·일정·품질·검수·남은 일을 정리합니다.	어떻게	07 운영 및 유지보수 단계에서 초안을 만들고 확정합니다.	결과	계획 대비 실적과 남은 과제가 고객·회사 보고용 문서로 남습니다.

프로젝트 건강도

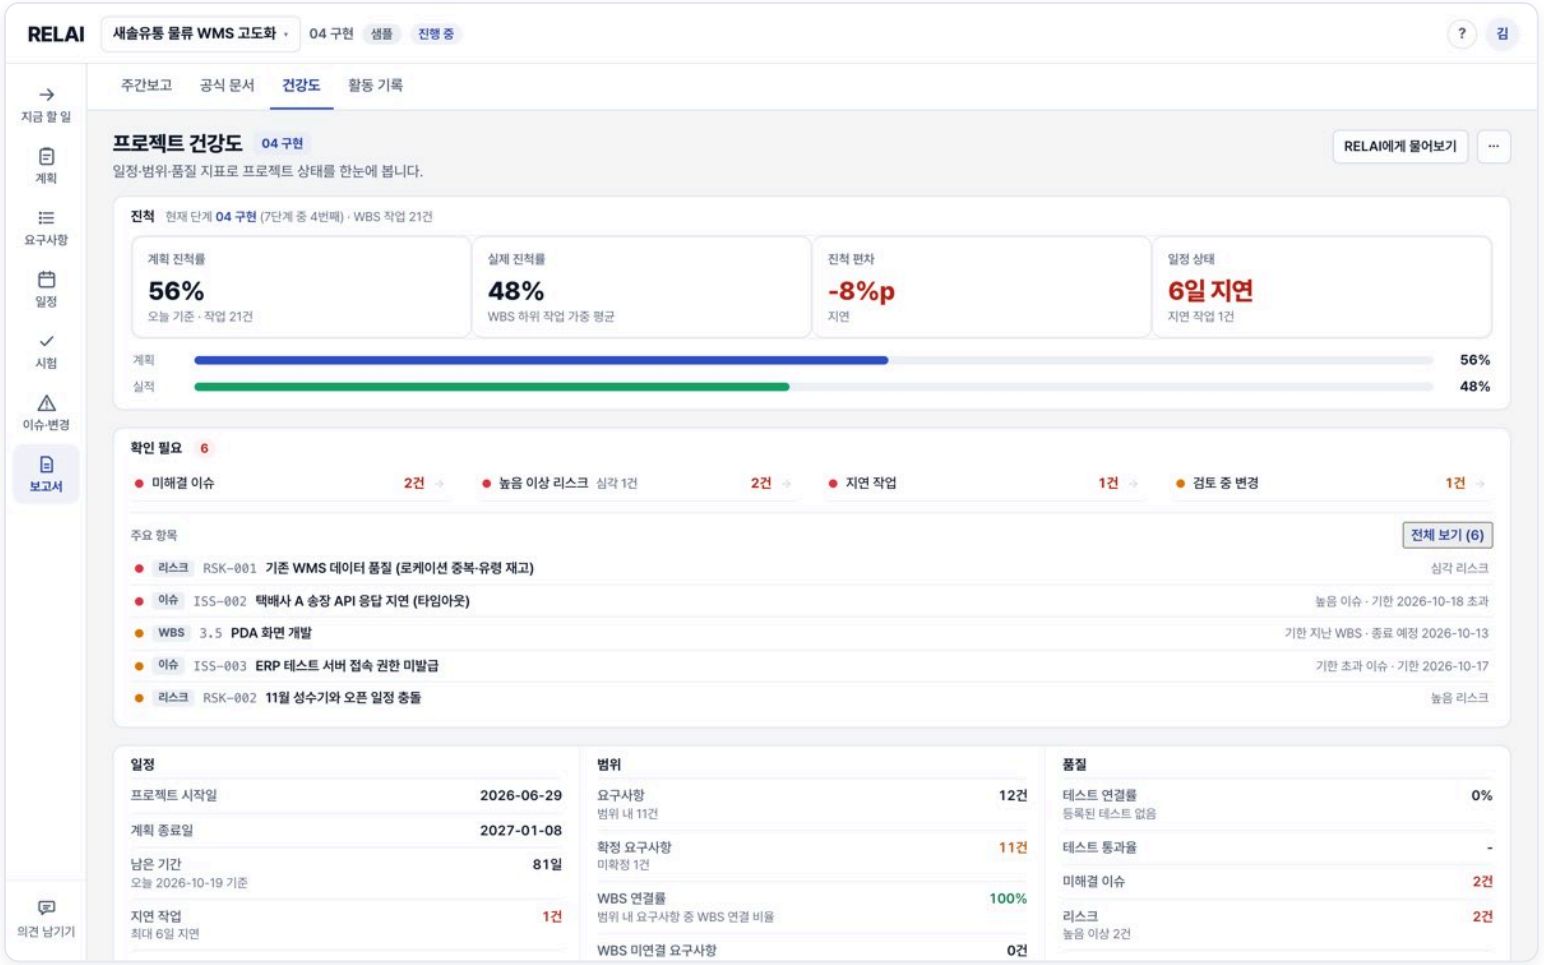

무엇을	진척(계획 vs 실제), 확인 필요 항목, 일정·범위·품질 지표를 한 화면에 봅니다.
어떻게	보고서 › 건강도 탭. "확인 필요" 항목을 누르면 해당 이슈·리스크·작업으로 갑니다.
결과	예) 계획 56% · 실제 48% · 6일 지연 — 무엇이 늦는지 바로 압니다.

07 운영 및 유지보수 — 마지막 단계

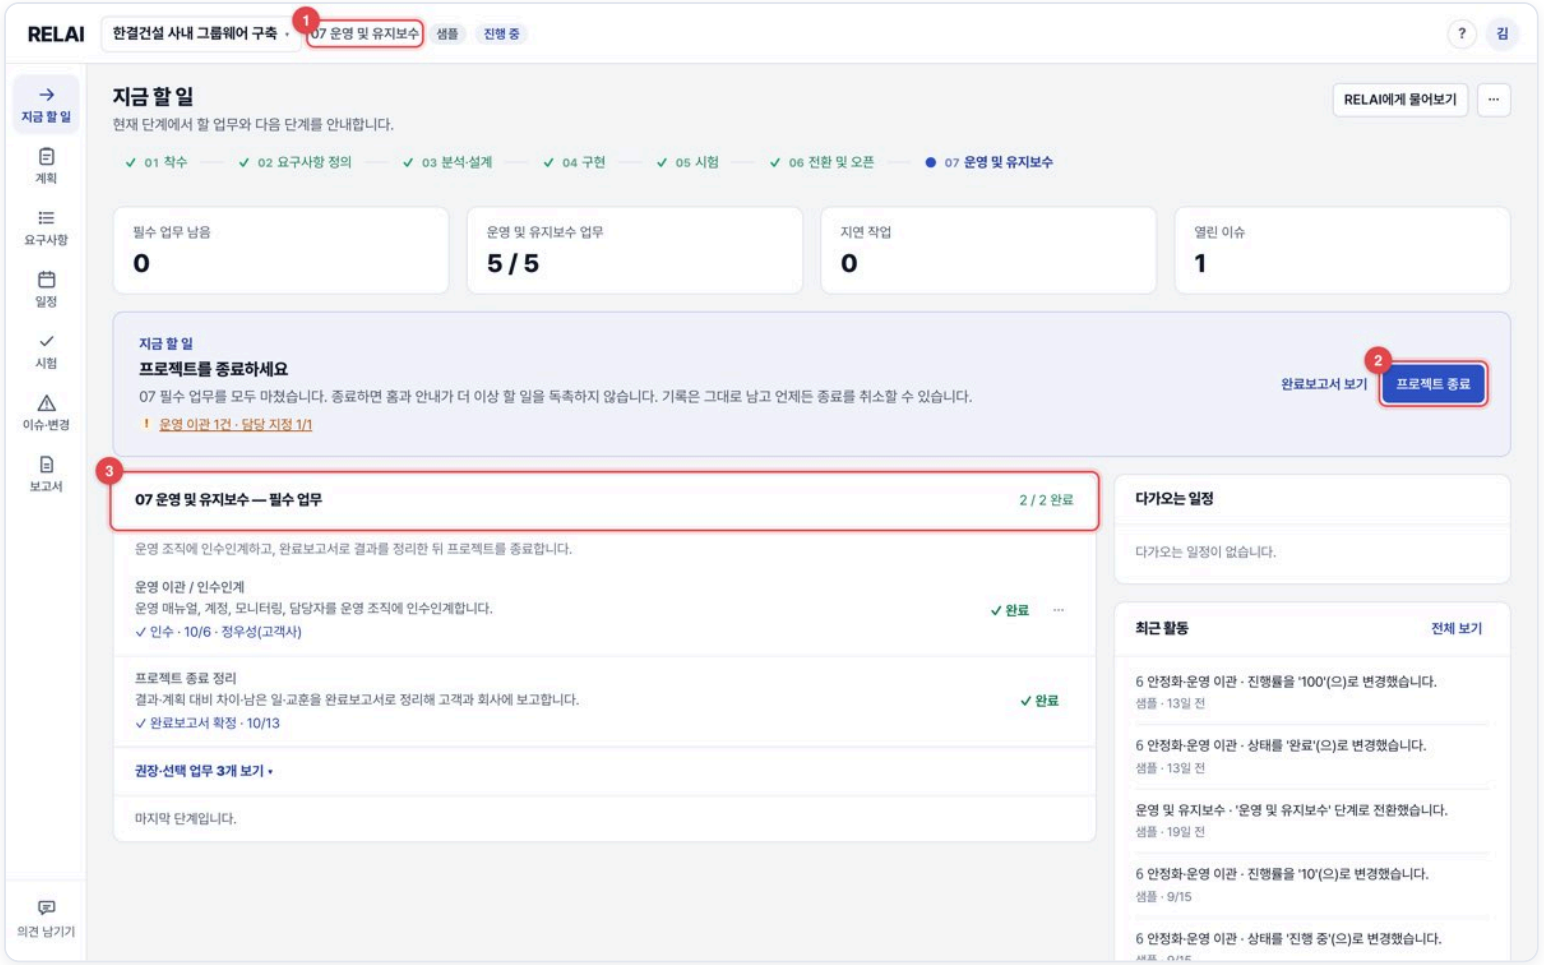


화면 번호 설명

1. 07 운영 및 유지보수가 현재 단계입니다.
2. [프로젝트 종료] — 필수 업무가 끝나면 누릅니다. 종료해도 기록은 그대로 남고 언제든 되돌릴 수 있습니다.
3. 필수 업무 — 운영 이관/인수인계, 프로젝트 종료 정리.

무엇을	어떻게	결과
시스템을 운영 조직에 넘기고 프로젝트를 닫습니다.	운영 이관 체크리스트를 끝내고 완료보고서를 확정합니다.	종료된 프로젝트는 더 이상 할 일을 독촉하지 않습니다.

운영 이관 / 인수인계 체크리스트

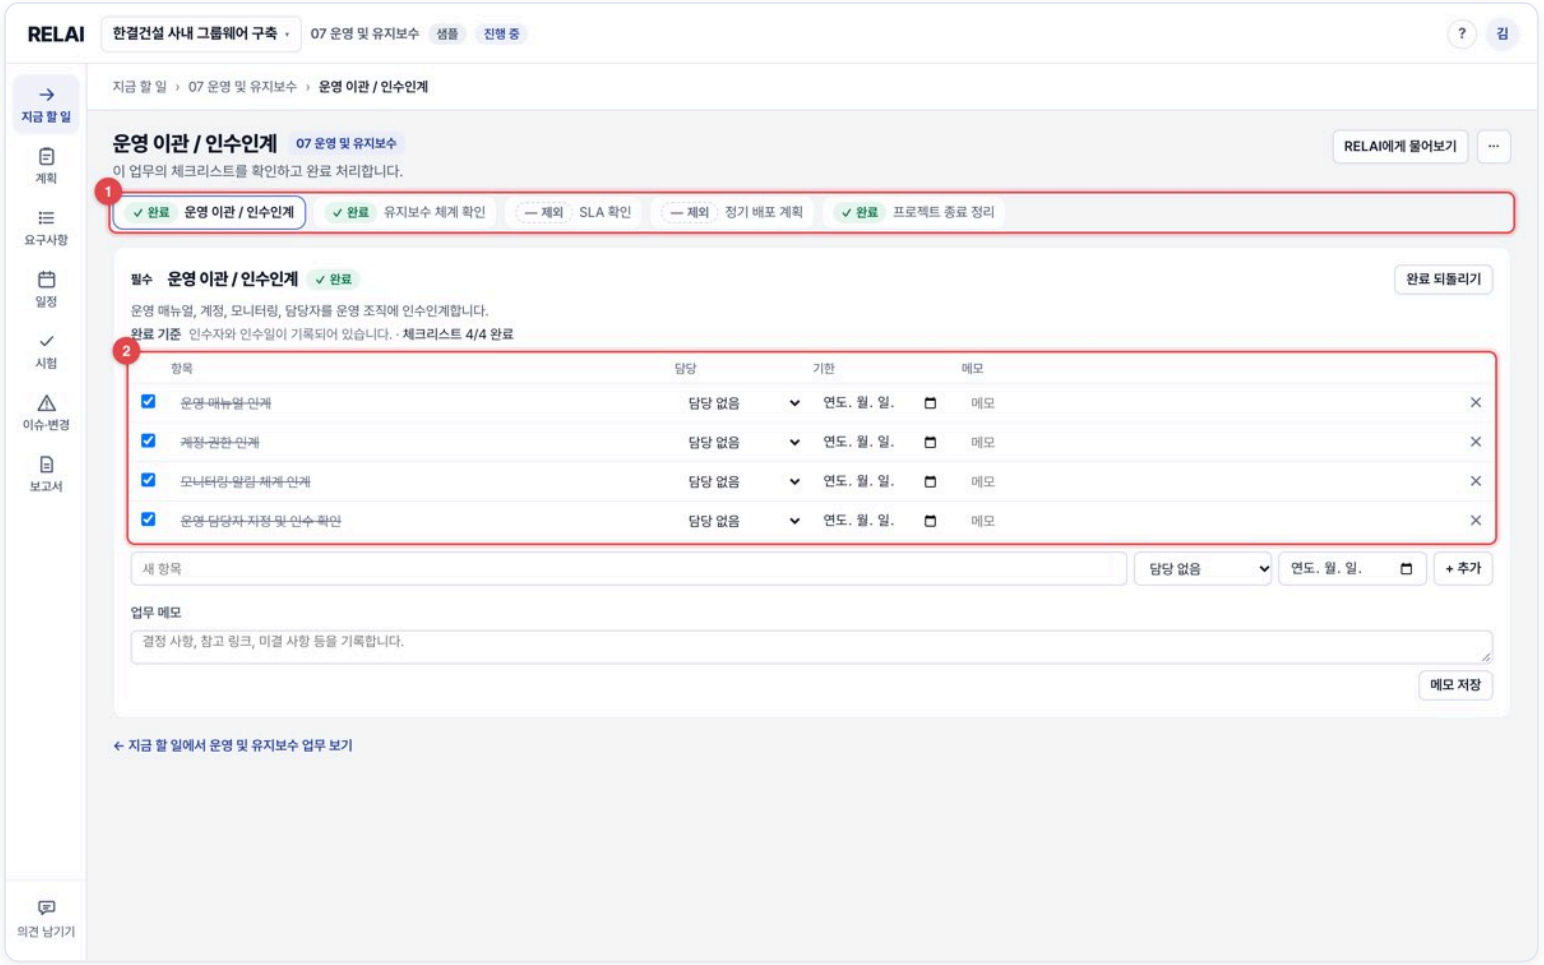

화면 번호 설명

1. 업무 탭 — 운영 이관/인수인계, 유지보수 체계 확인, SLA 확인, 정기 배포 계획, 프로젝트 종료 정리. 필요 없는 업무는 "제외"합니다.
2. 체크리스트 — 운영 매뉴얼, 계정·권한, 모니터링, 운영 담당자 인수 확인. 항목마다 담당·기한·메모.


무엇을	어떻게	결과
운영 매뉴얼·계정·모니터링·담당자를 빠짐없이 넘깁니다.	[기본 항목으로 시작]으로 체크리스트를 만들고 하나씩 체크합니다.	인수자와 인수일이 기록되면 업무가 완료됩니다.

05. AI 기능 4종

AI는 초안을 만들고, 사람은 고르고 확정합니다. 실행 전에 드는 크레딧을 먼저 보여 주고, 실패하면 차감하지 않습니다. (이 가이드의 AI 결과는 시험용 응답입니다.)


회의록에서 요구사항 뽑기

BEFORE 요구사항 9건

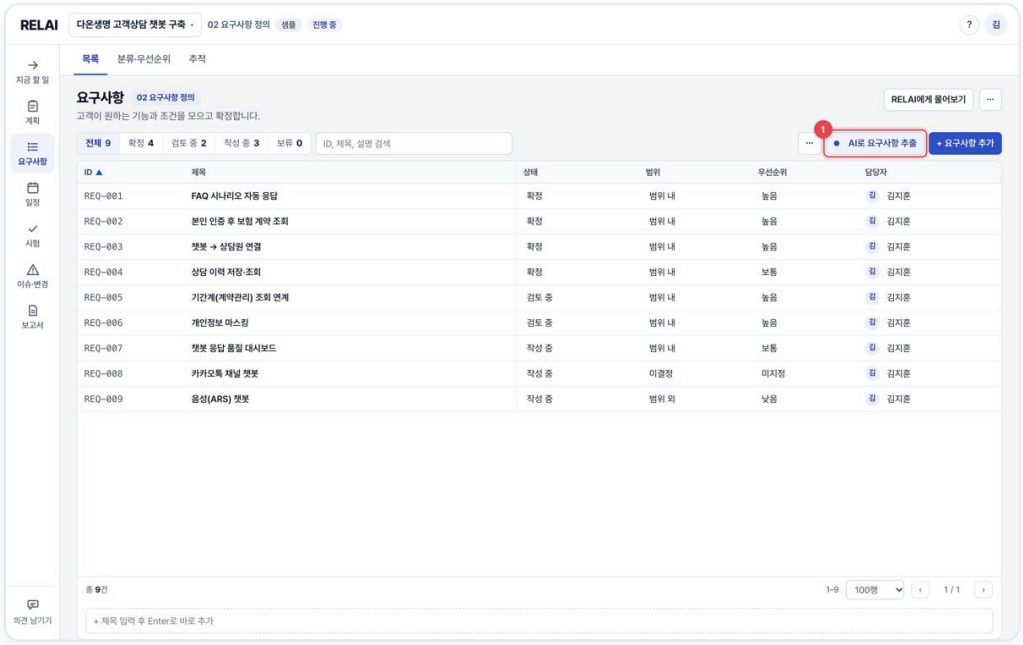

1. [AI로 요구사항 추출] (요구사항 목록 위)

회의록 붙여넣기

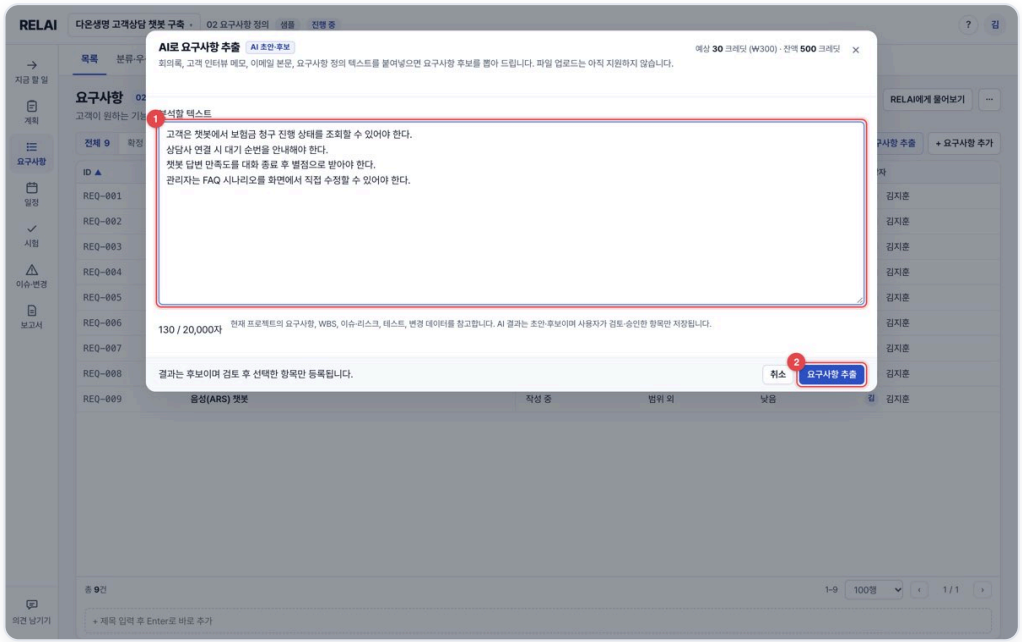


1. 회의록·메모·이메일 본문을 붙여넣습니다. (최대 20,000자)
2. [요구사항 추출] — 30 크레딧(₩300)

무엇을	회의록이나 고객 메일에서 요구사항 후보를 찾습니다.	어떻게	텍스트를 붙여넣고 실행합니다. 오른쪽 위에 예상 크레딧과 잔액이 보입니다.	결과	다음 장처럼 후보 목록이 나옵니다.


후보 검토 → 등록

AI 후보 4건

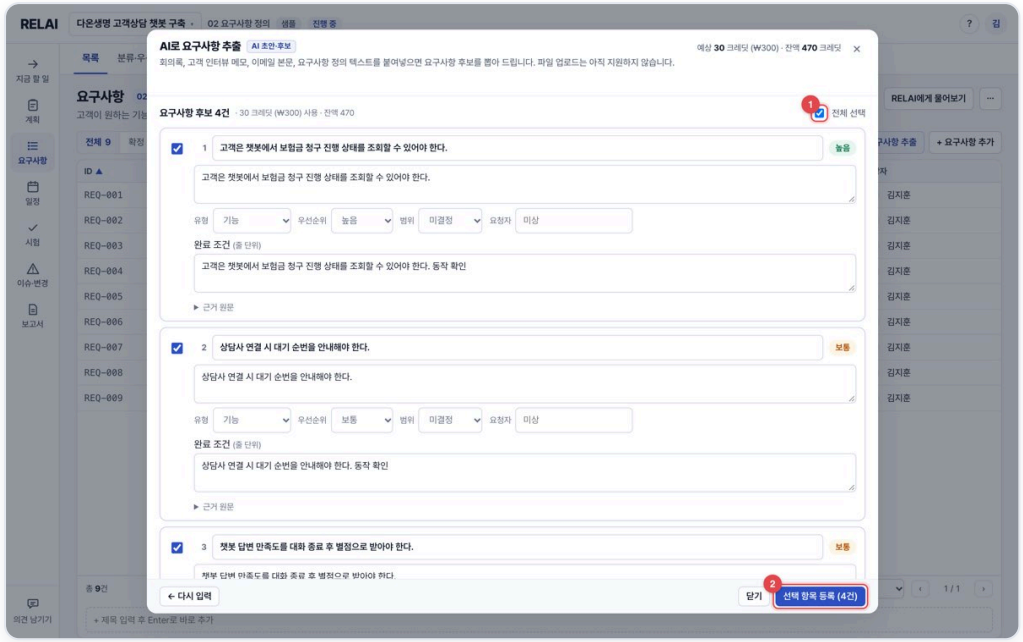

1. [전체 선택] 또는 후보마다 체크. 제목·유형·우선순위·범위·완료 조건을 고쳐서 등록할 수 있습니다.
2. [선택 항목 등록]

AFTER 요구사항 13건

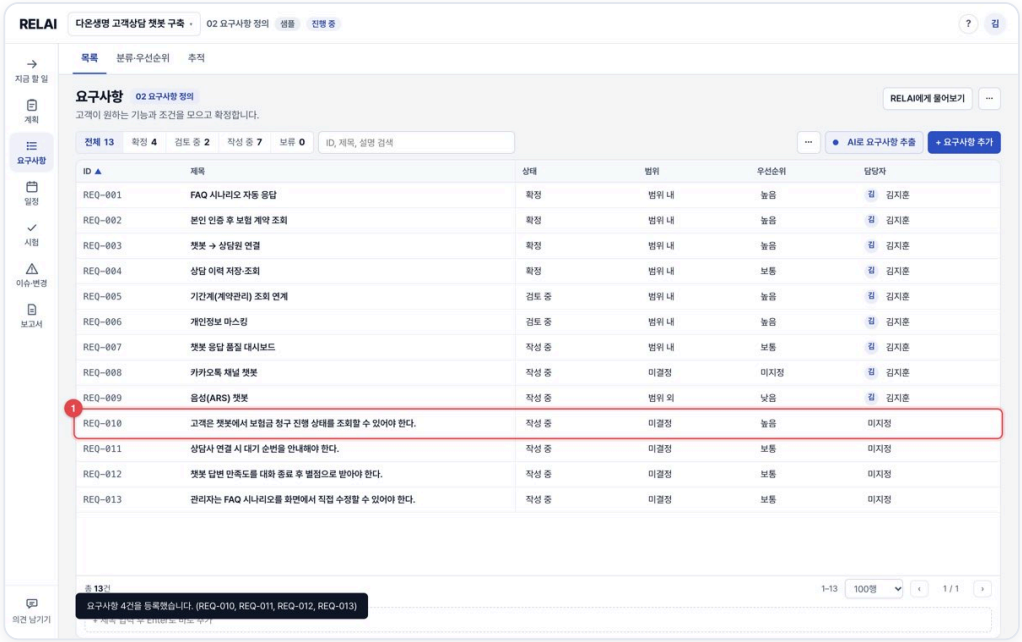


1. 새로 등록된 요구사항(REQ-010 ~ 013). 상태는 "작성 중"으로 들어갑니다.

무엇을	AI가 찾은 후보 중 맞는 것만 고릅니다.	어떻게	체크하고 필요하면 고친 뒤 [선택 항목 등록]을 누릅니다.	결과	선택한 후보만 요구사항이 됩니다. 확정은 사람이 합니다.

대상 요구사항 고르기

BEFORE WBS 없음

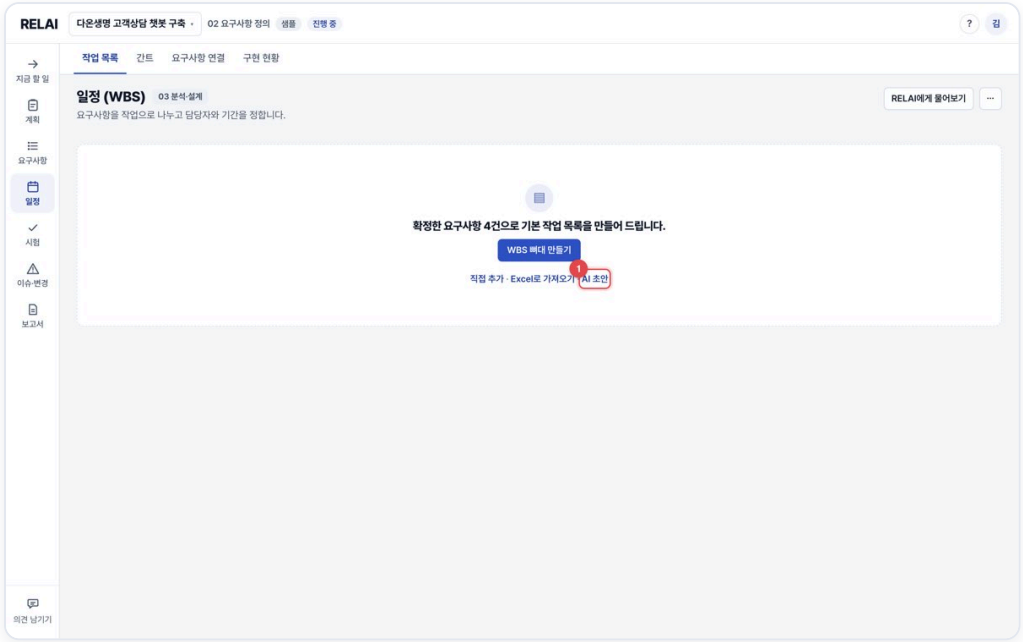

1 [AI 초안] (WBS가 비어 있을 때) / [AI로 초안 만들기] (툴바)

① 대상 확인




1 확정·작성 중 요구사항이 기본으로 선택됩니다. 반려·범위 외는 빠집니다.

2 [다음: 추가 확인 질문]

무엇을	요구사항과 프로젝트 수행 업무(데이터 이관·인프라·연계·전환·교육)로 전체 WBS 초안을 만듭니다.	어떻게	6단계 마법사: 대상 확인 → 추가 확인 → AI 초안 생성 → 초안 검토 → 누락 검토 → WBS 반영.	결과	질문 단계까지는 크레딧이 들지 않습니다.


질문에 답하고 초안 받기

② 추가 확인

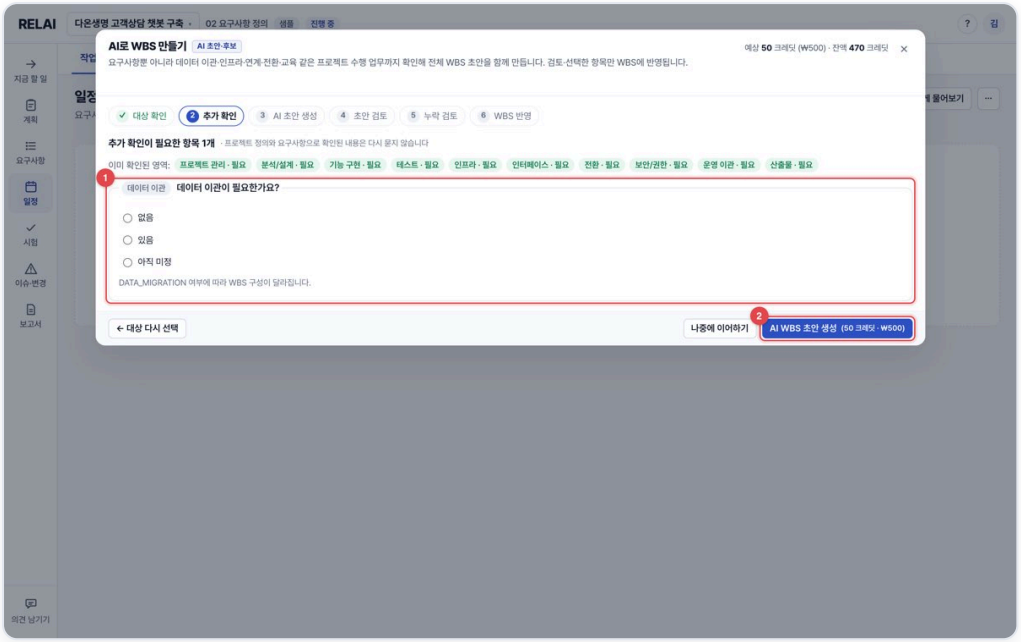

1. 프로젝트 정의에 없는 것만 묻습니다. (예: 데이터 이관이 필요한가요?)
2. [AI WBS 초안 생성] — 50 크레딧(₩500)

④ 초안 검토

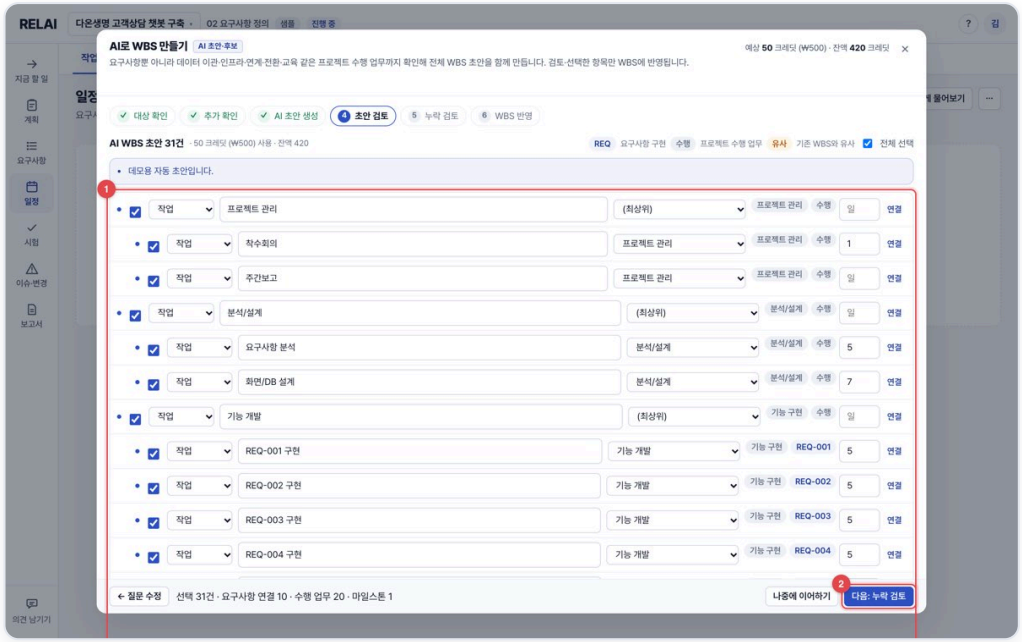

1. 초안 트리 — 작업마다 상위 작업, 영역, 기간(일), 연결 요구사항. 제목·구조를 바로 고칠 수 있습니다.
2. [다음: 누락 검토]

무엇을	AI가 프로젝트 관리·분석/설계·기능 개발·테스트 등으로 나눈 WBS 초안을 만듭니다.	어떻게	필요 없는 작업은 체크를 풉니다.	결과	예) 31건 — 요구사항 연결 10, 수행 업무 20, 마일스톤 1.


누락 검토 → WBS 반영

⑤ 누락 검토



1 요구사항 연결 현황(100%)과 수행 업무 포함 현황을 봅니다. 빠진 영역은 [누락 작업 추가 제안](무료)으로 보완합니다. 확인 후 [WBS에 반영].

AFTER WBS 31건

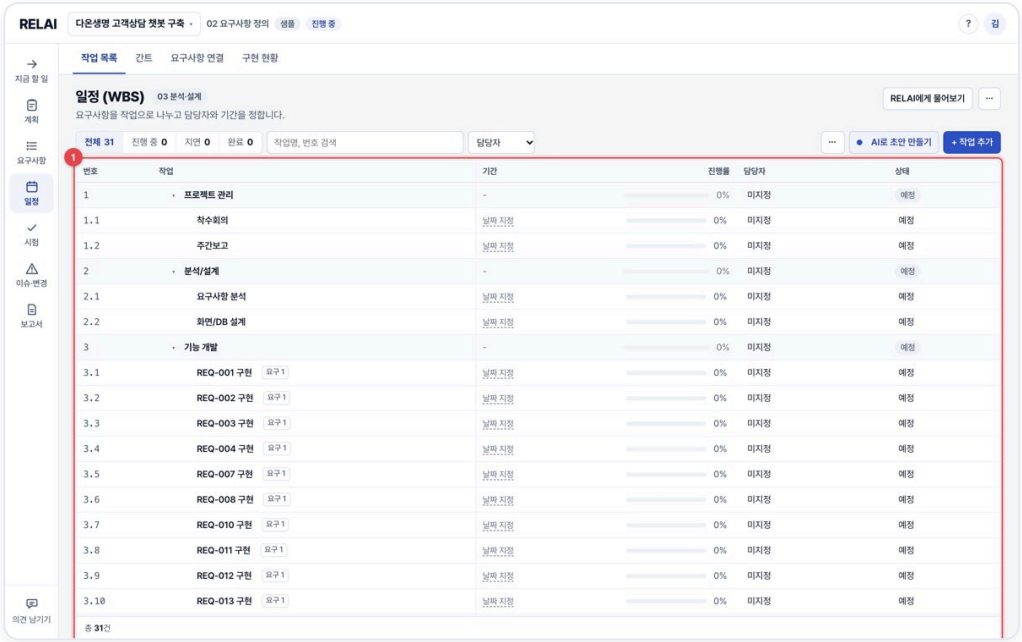


1 반영된 WBS. 날짜·담당자를 정하면 간트와 진척률에 바로 쓰입니다.

무엇을	빠진 영역(보안·운영 이관 등)을 확인하고 WBS로 저장합니다.	어떻게	[WBS에 반영] → 확인 창에서 한 번 더 누릅니다.	결과	빈 WBS가 몇 분 만에 31개 작업으로 채워집니다.


변경 요청의 영향 찾기

BEFORE 영향 요구사항 1, WBS 0

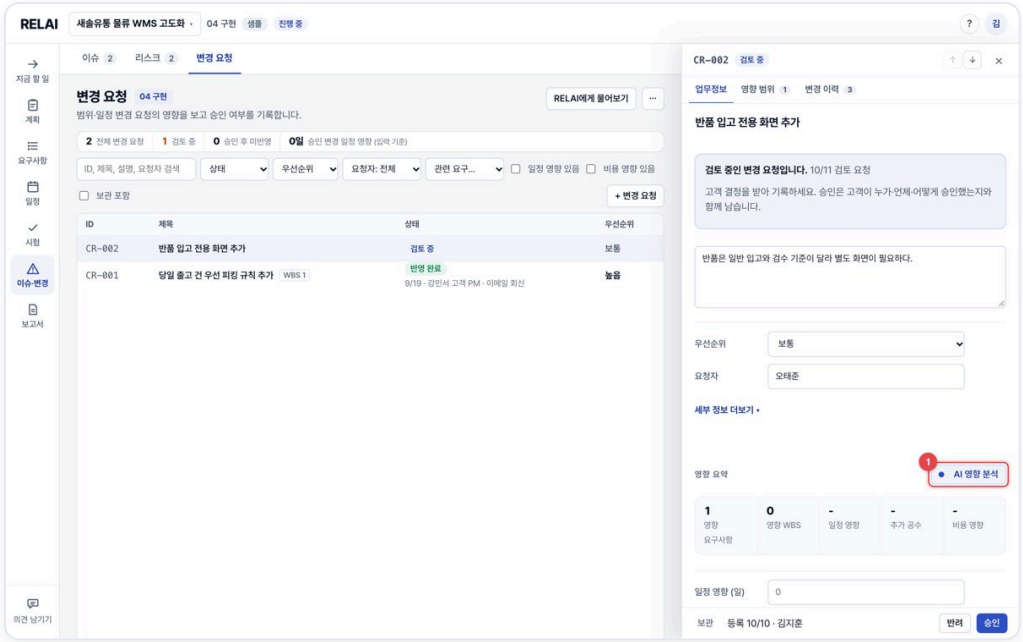

1 변경 요청 상세의 [AI 영향 분석] — 20 크레딧(₩200)

AI 영향 후보

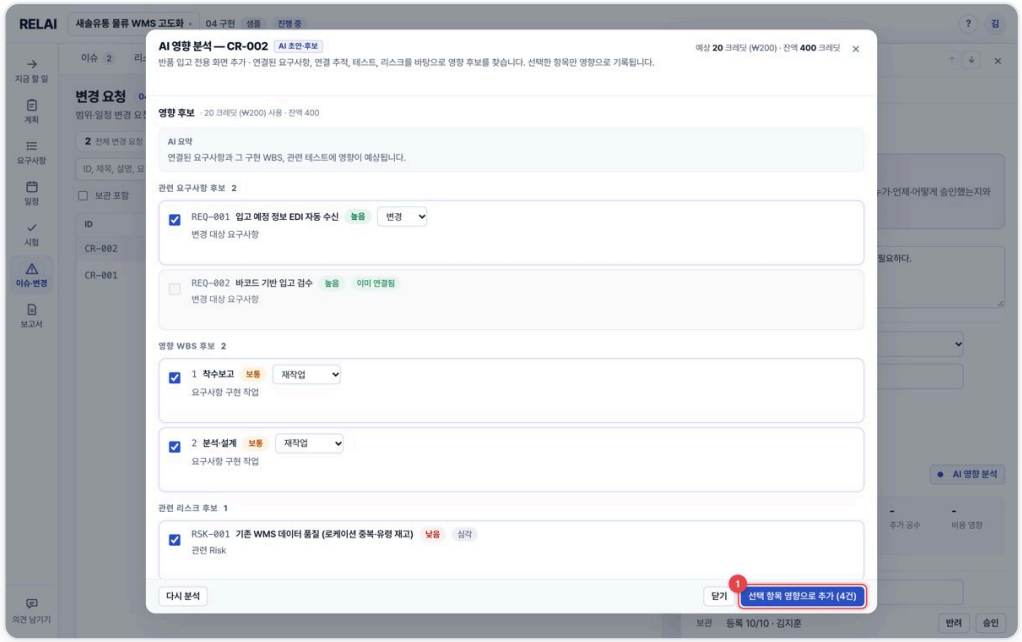


1 관련 요구사항·WBS·리스크 후보를 고르고 [선택 항목 영향으로 추가]

무엇을	변경 요청이 어떤 요구사항·작업·리스크에 영향을 주는지 찾습니다.	어떻게	분석을 실행하고 맞는 후보만 체크합니다. (반영 완료된 변경 요청에는 버튼이 없습니다.)	결과	다음 장처럼 영향 범위가 채워집니다.

AFTER — 영향 범위가 채워진 변경 요청


AFTER

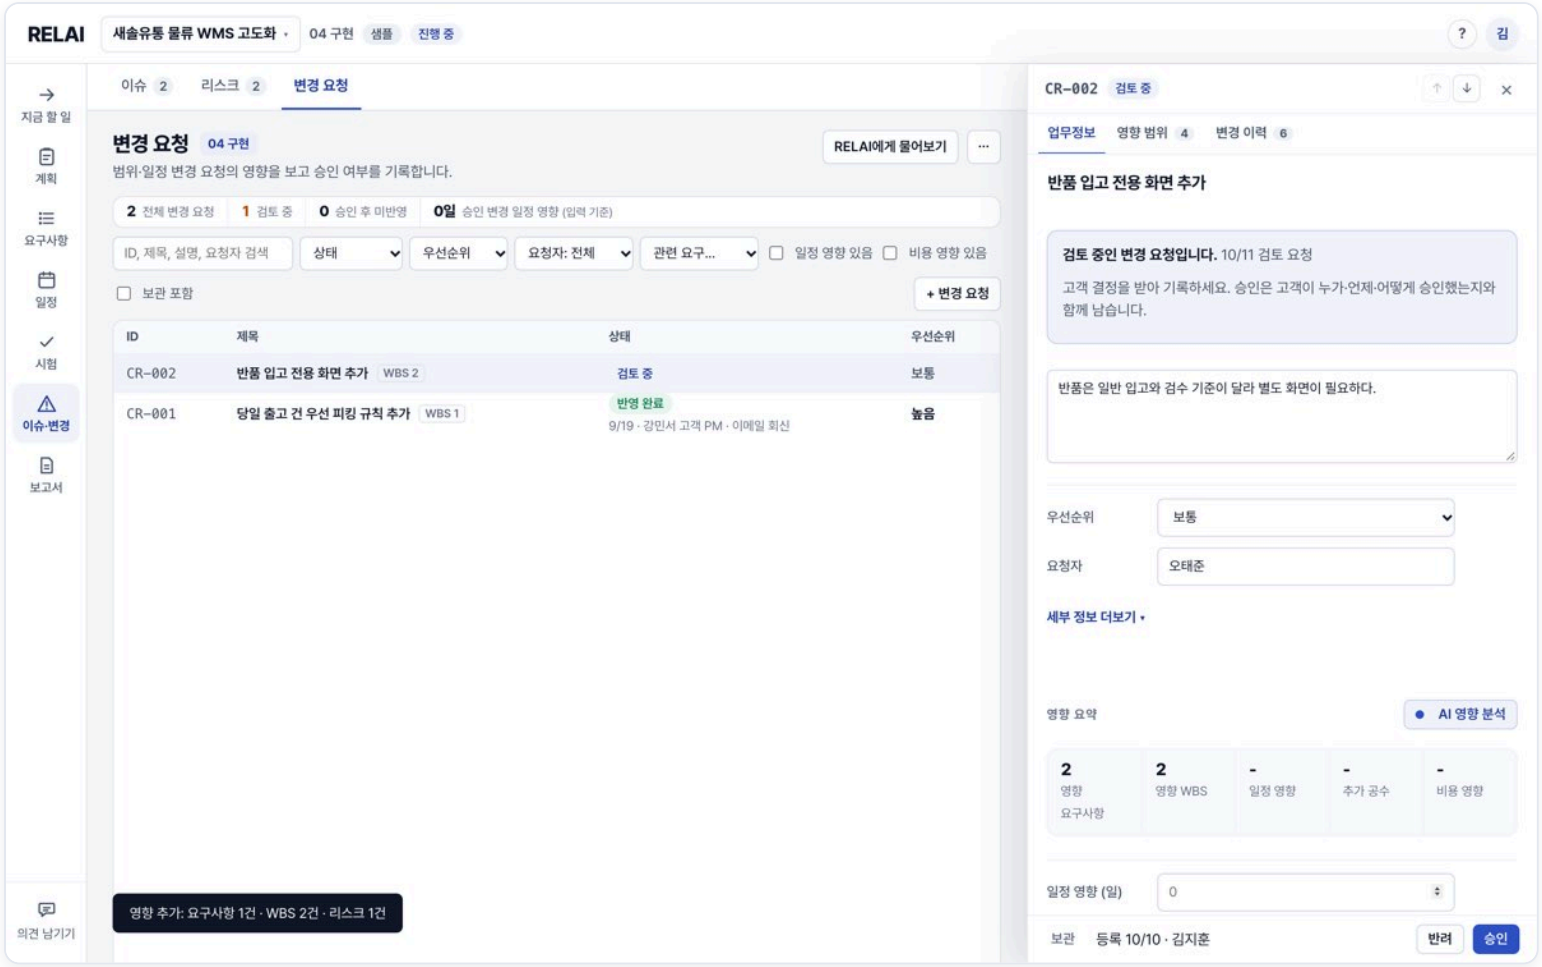

무엇을	영향 요구사항 2, 영향 WBS 2, 관련 리스크 1이 기록되었습니다.
어떻게	"영향 범위" 탭에서 확인하고, 일정·비용 영향(일)을 입력합니다.
결과	고객에게 승인을 받을 때 영향 근거를 함께 보여 줄 수 있습니다.


프로젝트에 대해 질문하기

BEFORE 질문 입력

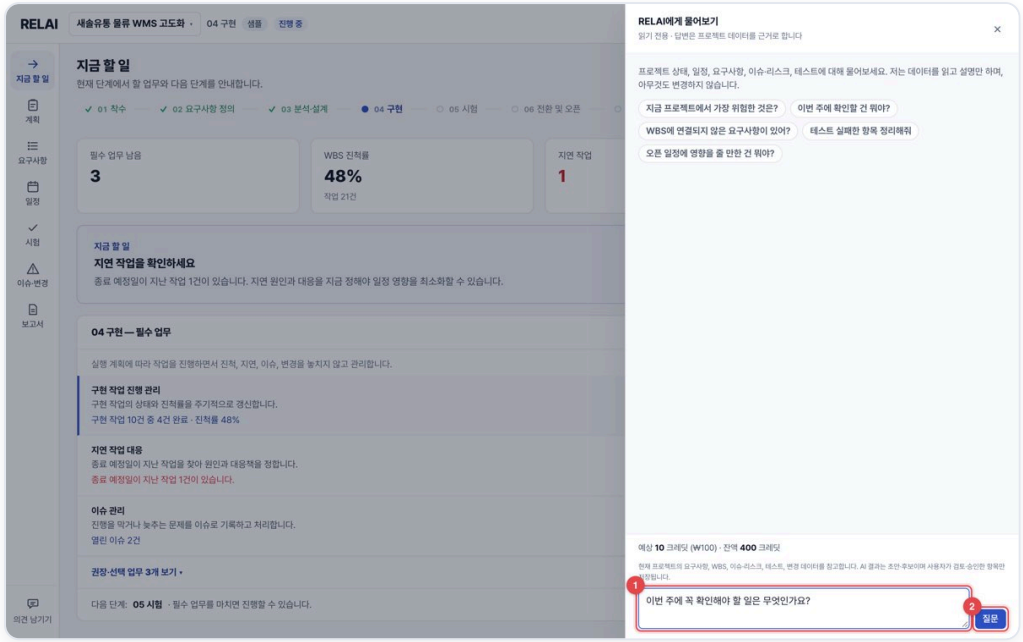

1. 질문을 입력합니다. (예: 이번 주에 꼭 확인해야 할 일은?)
2. [질문] — 10 크레딧(₩100)


AFTER 답변

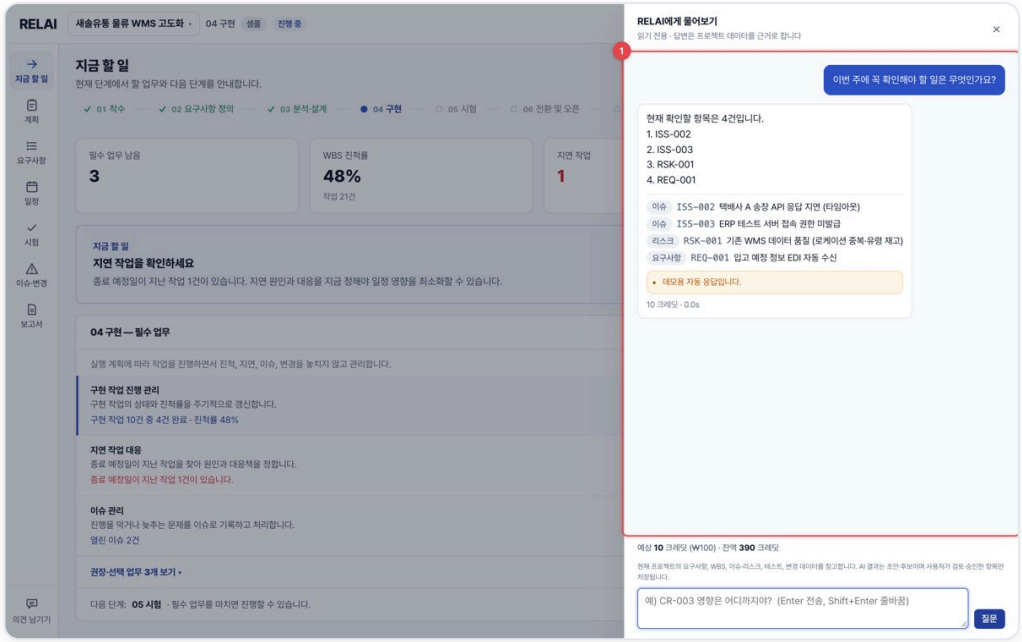

1. 답변 — 프로젝트 데이터(요구사항·WBS·이슈·리스크·변경)를 근거로 답하고, 근거 항목을 링크로 붙입니다.

무엇을	모든 화면 오른쪽 위 [RELAI에게 물어보기]로 프로젝트에 대해 묻습니다.	어떻게	자연어로 묻고 Enter. 읽기 전용이라 데이터를 바꾸지 않습니다.	결과	근거 항목을 눌러 바로 해당 이슈·리스크로 이동합니다.

AI 크레딧 — 쓴 만큼만

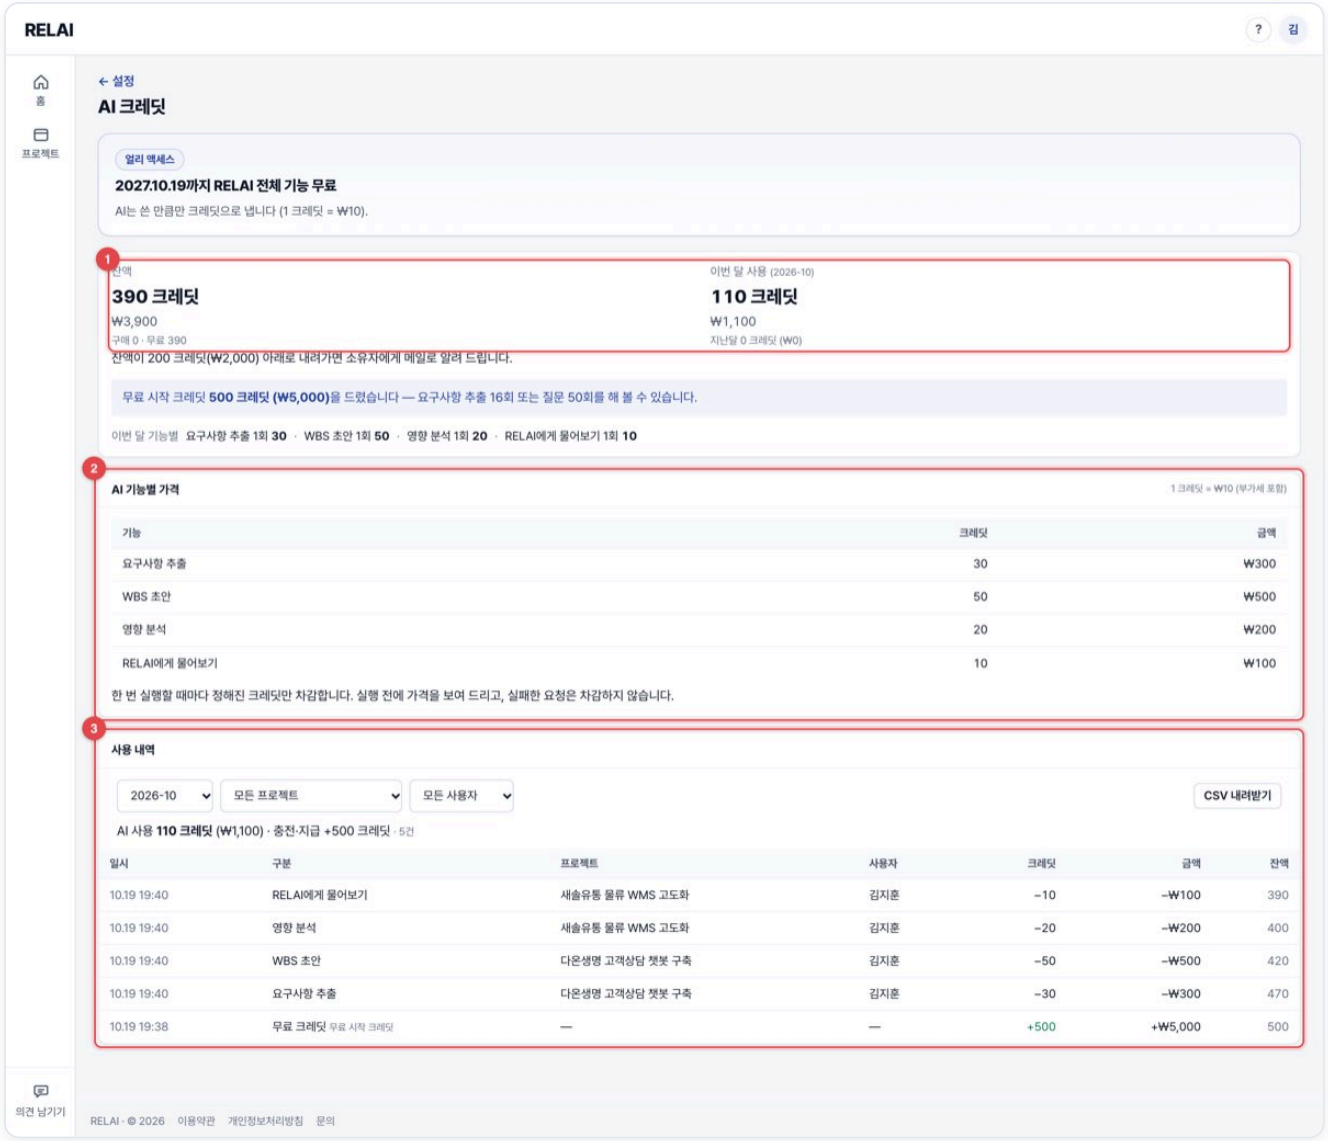

화면 번호 설명

1. 잔액과 이번 달 사용량 (위 4가지 AI 기능을 한 번씩 쓴 뒤: 500 → 390 크레딧).
2. AI 기능별 가격 — 요구사항 추출 30 · WBS 초안 50 · 영향 분석 20 · 물어보기 10 크레딧. 1 크레딧 = ₩10(부가세 포함).
3. 사용 내역 — 일시, 기능, 프로젝트, 사용자, 크레딧, 금액, 잔액. CSV로 내려받습니다.


무엇을	어떻게	결과
AI 사용량과 남은 크레딧을 확인합니다.	설정 › 요금제 › AI 크레딧 [자세히].	가입 시 500 크레딧(₩5,000)을 무료로 드립니다. 잔액이 200 아래로 내려가면 소유자에게 메일로 알려 줍니다.

06. 가이드 '샘플로 보기'


프로젝트 관리 방법을 몰라도 괜찮습니다. 완성된 샘플을 보며 "왜 이걸 쓰는지"를 먼저 익힙니다.

RELAI 가이드 · 샘플로 보기

가이드

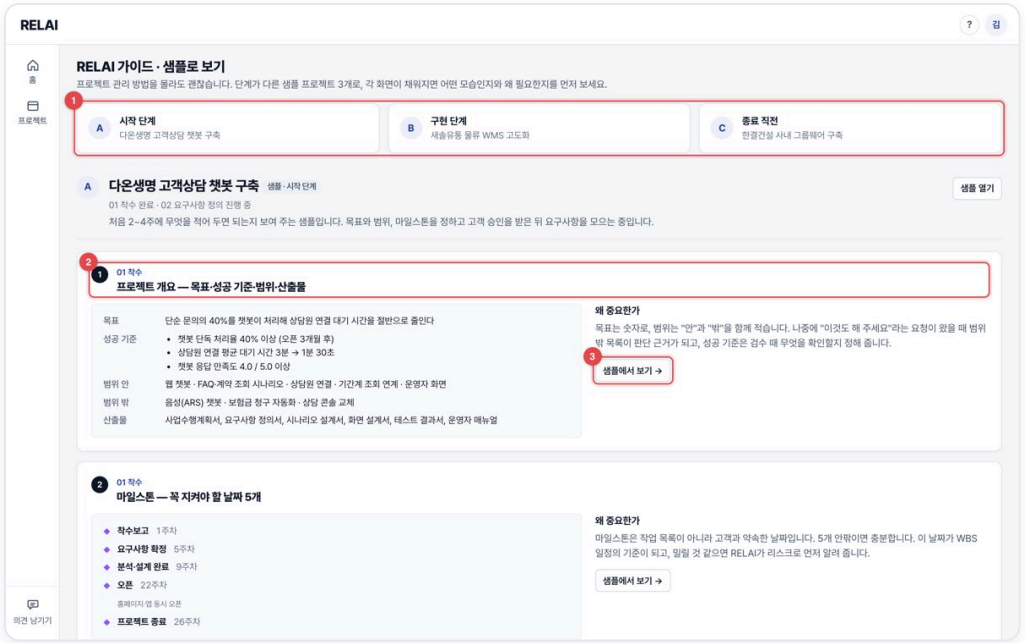

[샘플에서 보기]를 누른 뒤

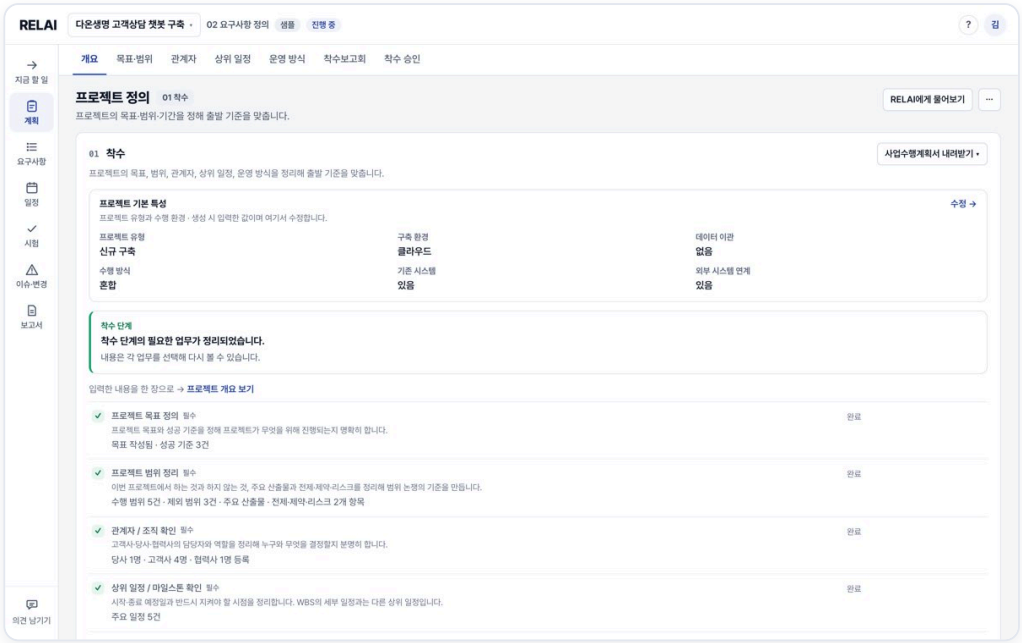

1. 단계가 다른 샘플 3개 — A 시작 단계, B 구현 단계, C 종료 직전.
2. 업무 카드 — 샘플에 실제로 채워진 내용(목표·범위·산출물 등)과 "왜 중요한가".
3. [샘플에서 보기] — 그 내용이 있는 샘플 화면으로 바로 이동합니다.


무엇을	각 업무가 채워졌을 때의 모습과 이유를 봅니다.	어떻게	홈의 [샘플로 보는 가이드] 또는 ? 메뉴에서 엽니다.	결과	내 프로젝트에서 같은 화면을 어떻게 채우면 되는지 알게 됩니다.

07. 의견 남기기

불편한 점, 바라는 점, 오류를 화면을 떠나지 않고 RELAI 팀에 보냅니다.


의견 남기기

의견 작성

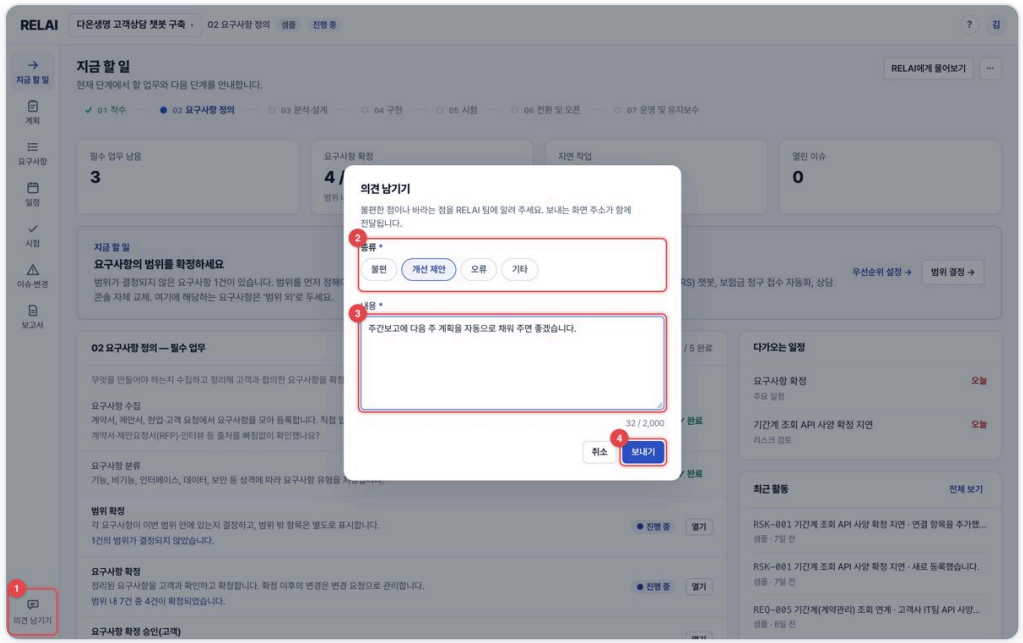

1. 왼쪽 아래 [의견 남기기] — 모든 화면에 있습니다.
2. 종류 — 불편 · 개선 제안 · 오류 · 기타
3. 내용 (2,000자까지)
4. [보내기]

보낸 뒤

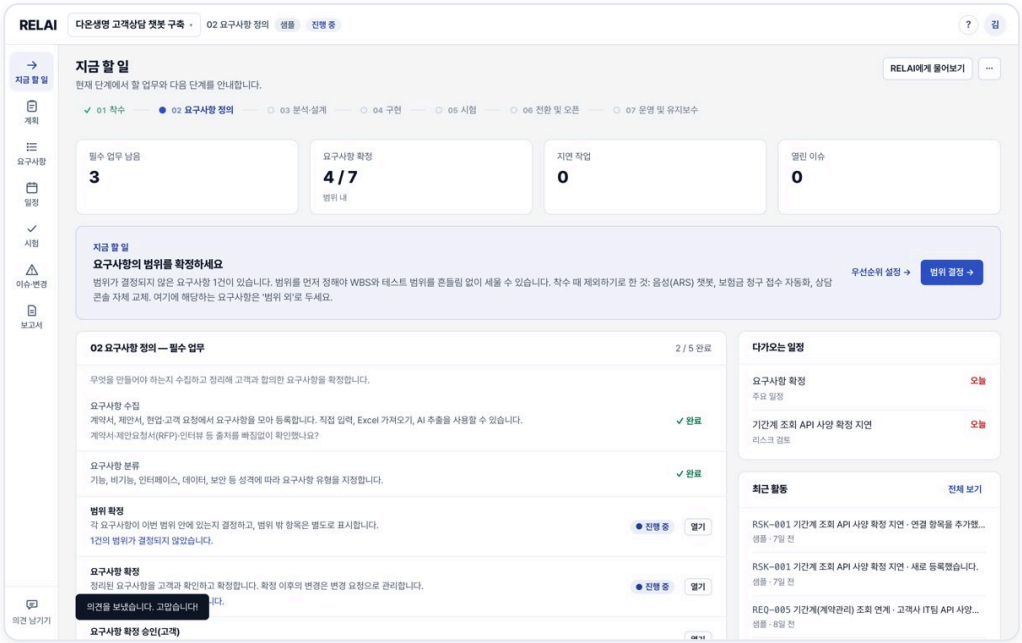

"의견을 보냈습니다. 고맙습니다!" — 보낸 화면 주소가 함께 전달됩니다.


무엇을	사용 중 느낀 점을 바로 보냅니다.	어떻게	종류를 고르고 내용을 적어 [보내기].	결과	관리자 콘솔 › 의견에 쌓이고 운영자가 처리 상태를 관리합니다.

08. 설정·멤버 초대·크레딧

팀원을 초대해 같은 워크스페이스에서 함께 일합니다.


팀원 초대

멤버 초대 창

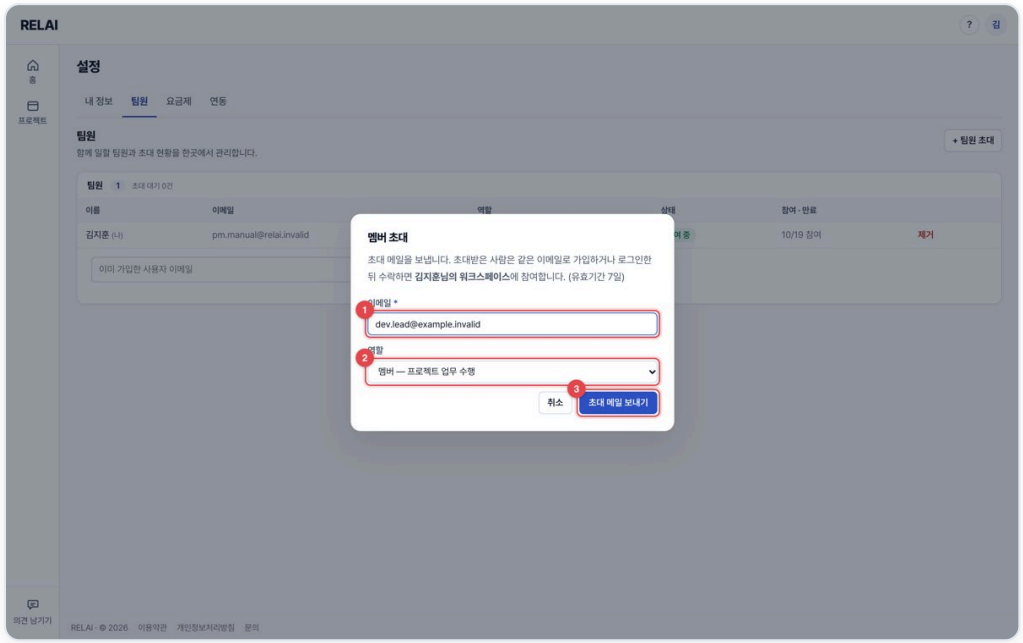

1. 초대할 사람의 이메일
2. 역할 — 멤버(프로젝트 업무 수행) 또는 관리자(프로젝트·멤버·설정 관리, 소유자만 지정)
3. [초대 메일 보내기] — 유효기간 7일


초대 후 팀원 목록

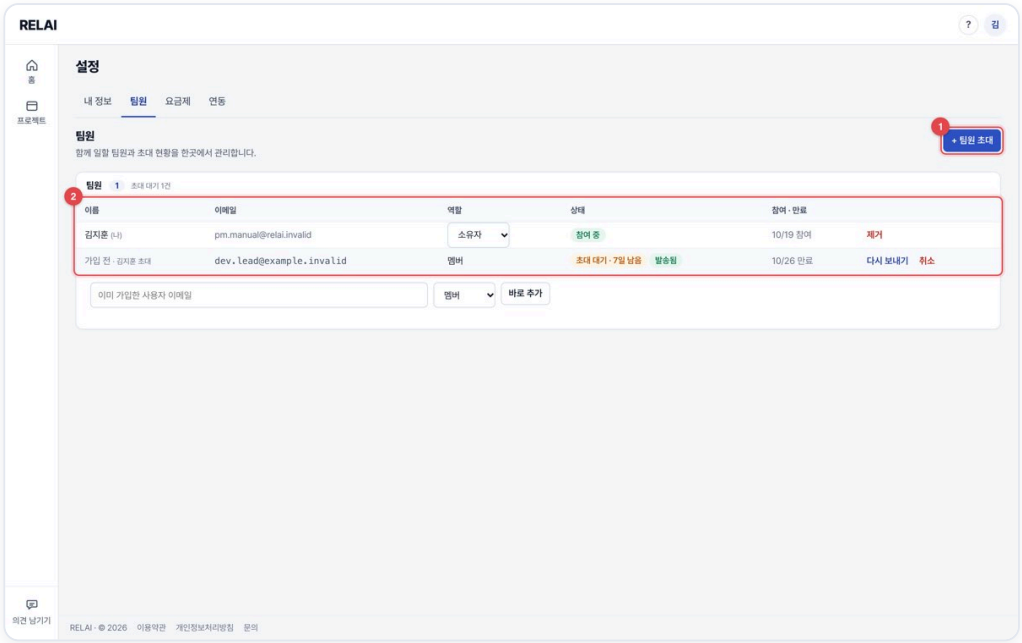

1. [+ 팀원 초대]
2. 팀원 목록 — 참여 중인 팀원과 "초대 대기 · 7일 남음" 행이 함께 보입니다. [다시 보내기]·[취소] 가능. 이미 가입한 사람은 아래 칸에 이메일을 넣고 [바로 추가].

무엇을	동료를 워크스페이스에 초대합니다.	어떻게	설정 › 팀원 › [+ 팀원 초대]. 초대받은 사람은 같은 이메일로 가입·로그인 후 수락합니다.	결과	프로젝트를 함께 보고, 담당자로 지정할 수 있습니다.

요금제

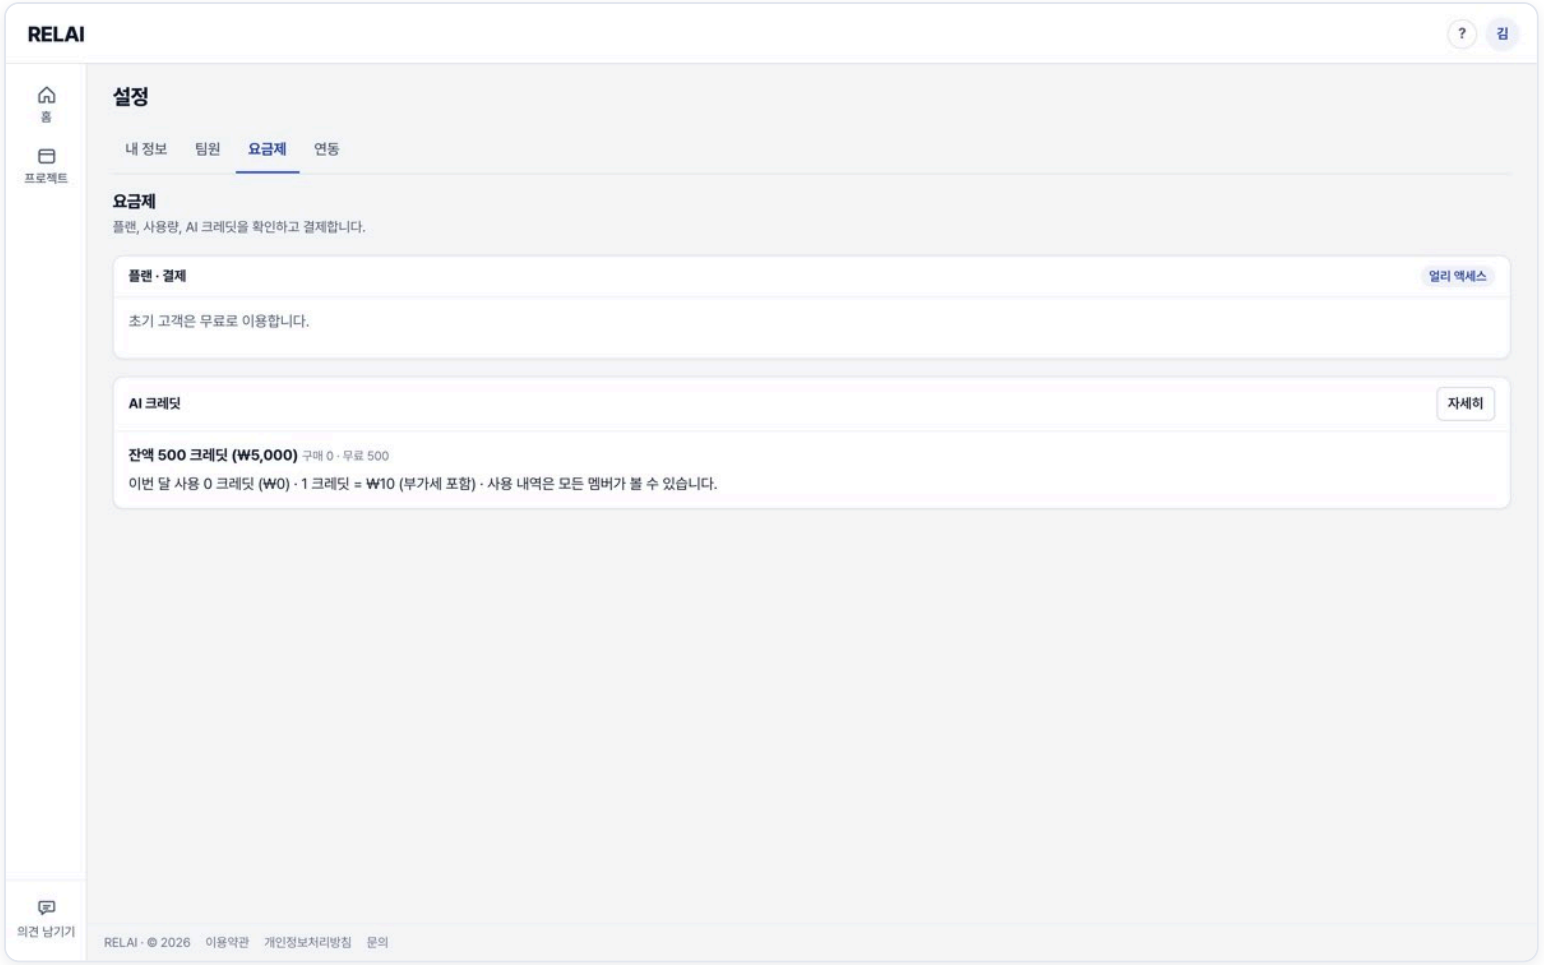


무엇을	현재 플랜과 AI 크레딧 잔액을 봅니다.
어떻게	설정 › 요금제. AI 크레딧 [자세히]는 5장 마지막 쪽 화면으로 이어집니다.
결과	지금은 얼리 액세스 — 초기 고객은 RELAI 전체 기능을 무료로 쓰고, AI만 쓴 만큼 크레딧이 차감됩니다.

09. 관리자 콘솔

RELAI 운영자(시스템 관리자)만 보는 화면입니다. 일반 사용자에게는 메뉴가 보이지 않습니다.

대시보드

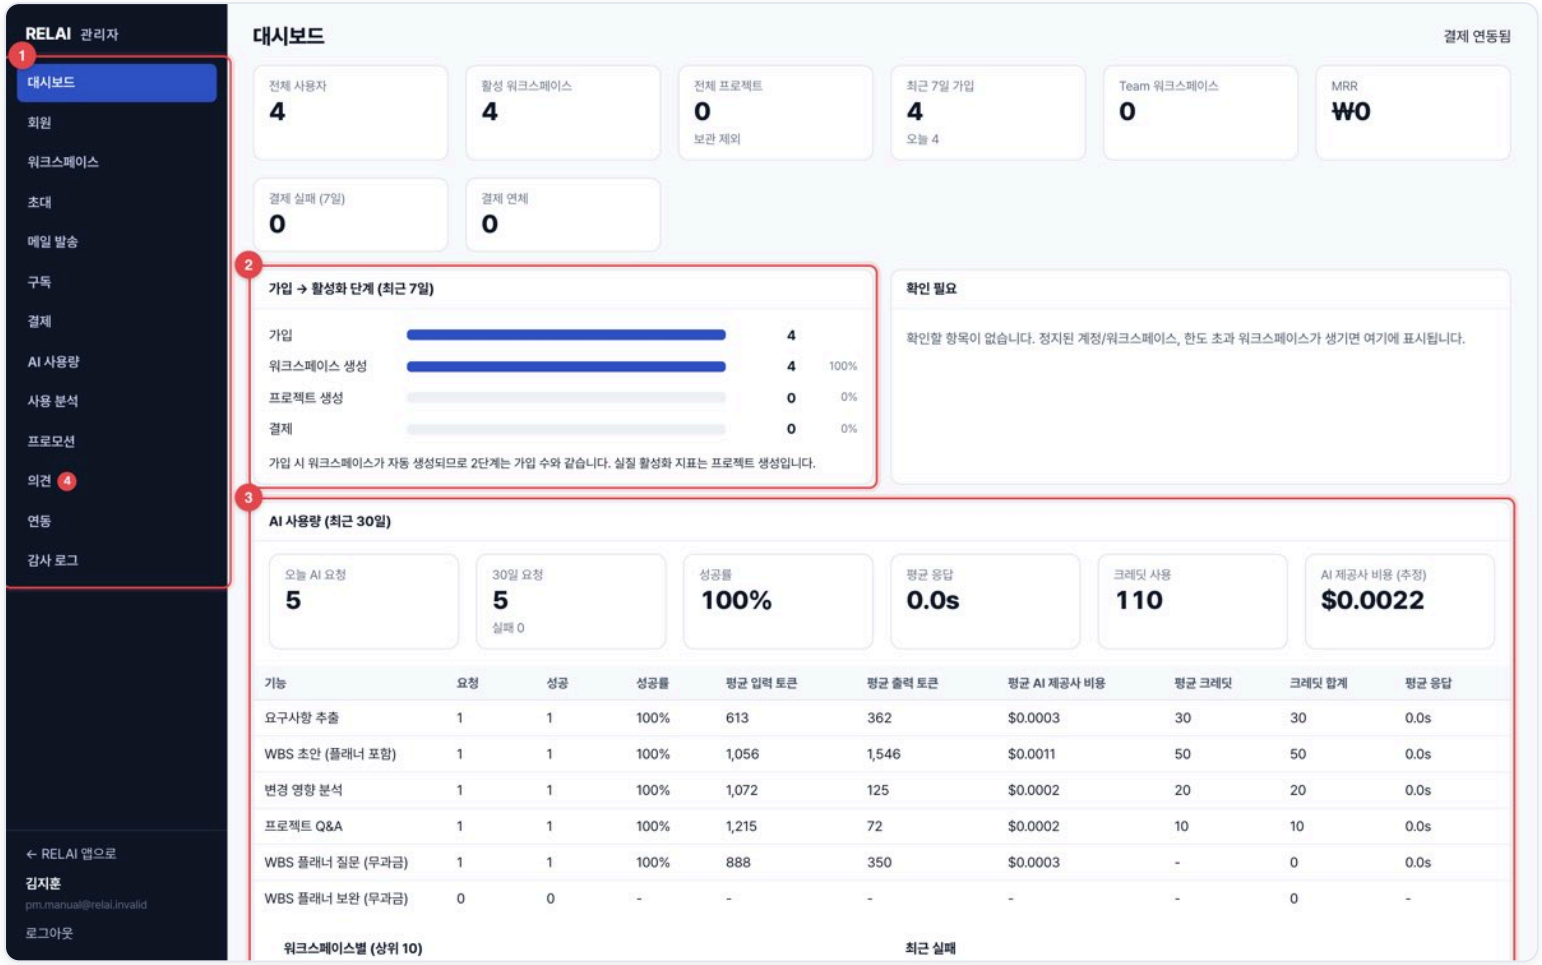


화면 번호 설명

1. 메뉴 — 대시보드, 회원, 워크스페이스, 초대, 메일 발송, 구독, 결제, AI 사용량, 사용 분석, 프로모션, 의견, 연동, 감사 로그.
2. 가입 → 활성화 단계(최근 7일) — 가입, 워크스페이스 생성, 프로젝트 생성, 결제.
3. AI 사용량(최근 30일) — 기능별 요청·성공률·토큰·AI 제공사 비용·크레딧.

무엇을	사용자 수, 활성 워크스페이스, 프로젝트, AI 사용량을 한눈에 봅니다.	어떻게	RELAI 앱의 프로필 메뉴 › 관리자 콘솔. (PC 전용)	결과	"확인 필요"에 정지 계정·한도 초과 워크스페이스가 모입니다. 샘플 프로젝트는 집계에서 빠집니다.


의견 관리

의견 목록

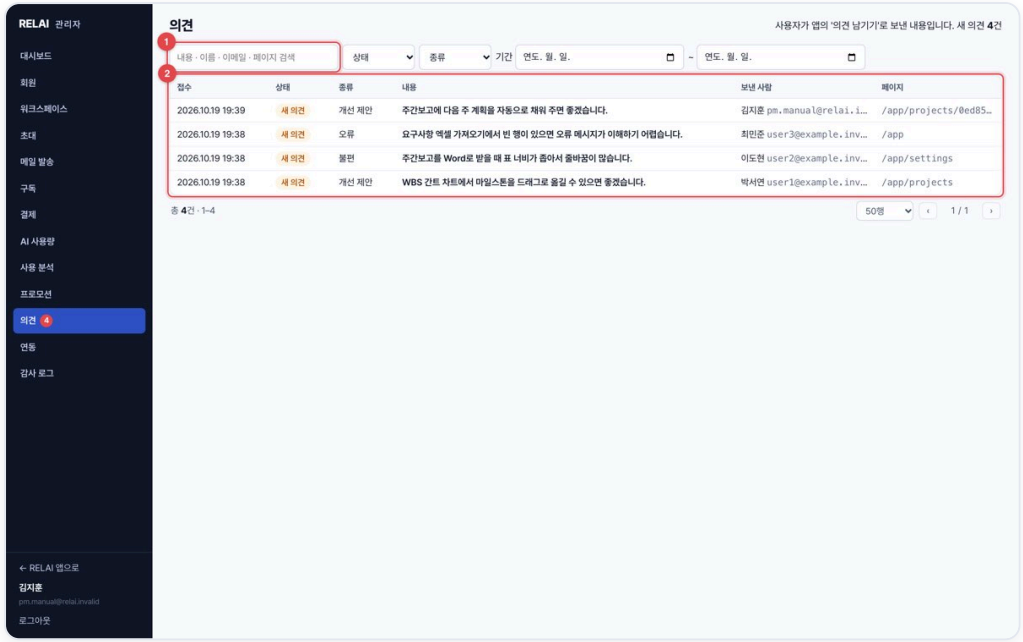

1. 검색·필터 — 내용·이름·이메일·페이지, 상태, 종류, 기간.
2. 목록 — 접수 일시, 상태(새 의견 등), 종류, 내용, 보낸 사람, 보낸 화면.


의견 상세

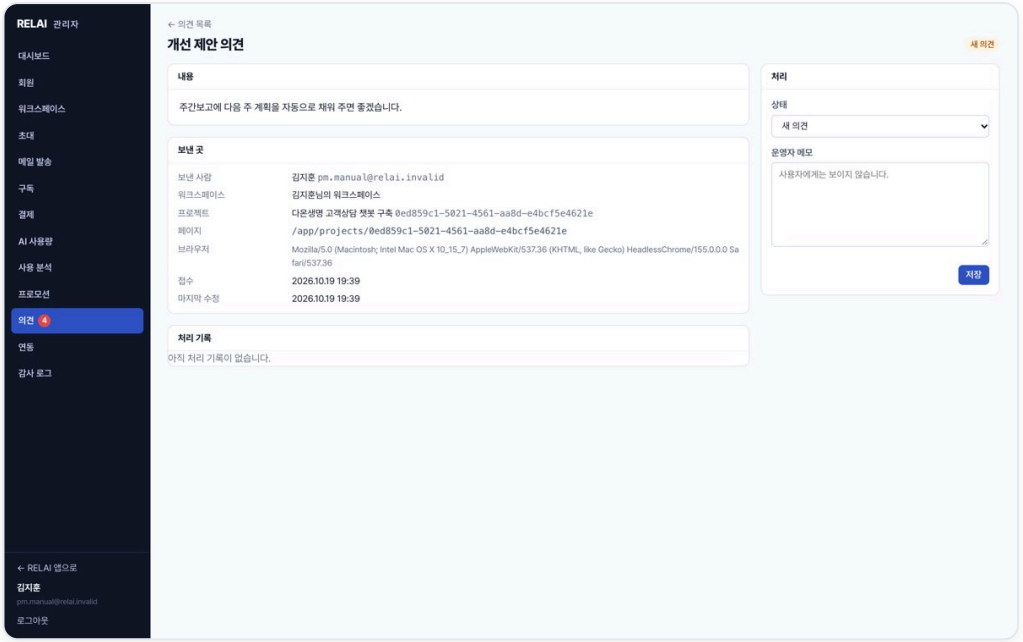

상세 — 보낸 사람, 워크스페이스, 프로젝트, 화면 주소, 브라우저. 오른쪽에서 상태를 바꾸고 운영자 메모(사용자에게 보이지 않음)를 남깁니다.

무엇을	사용자가 '의견 남기기'로 보낸 내용을 처리합니다.	어떻게	새 의견 수는 메뉴 배지로 보입니다. 상세에서 상태를 바꾸고 [저장].	결과	처리 기록이 남아 같은 의견을 두 번 보지 않습니다.

감사 로그

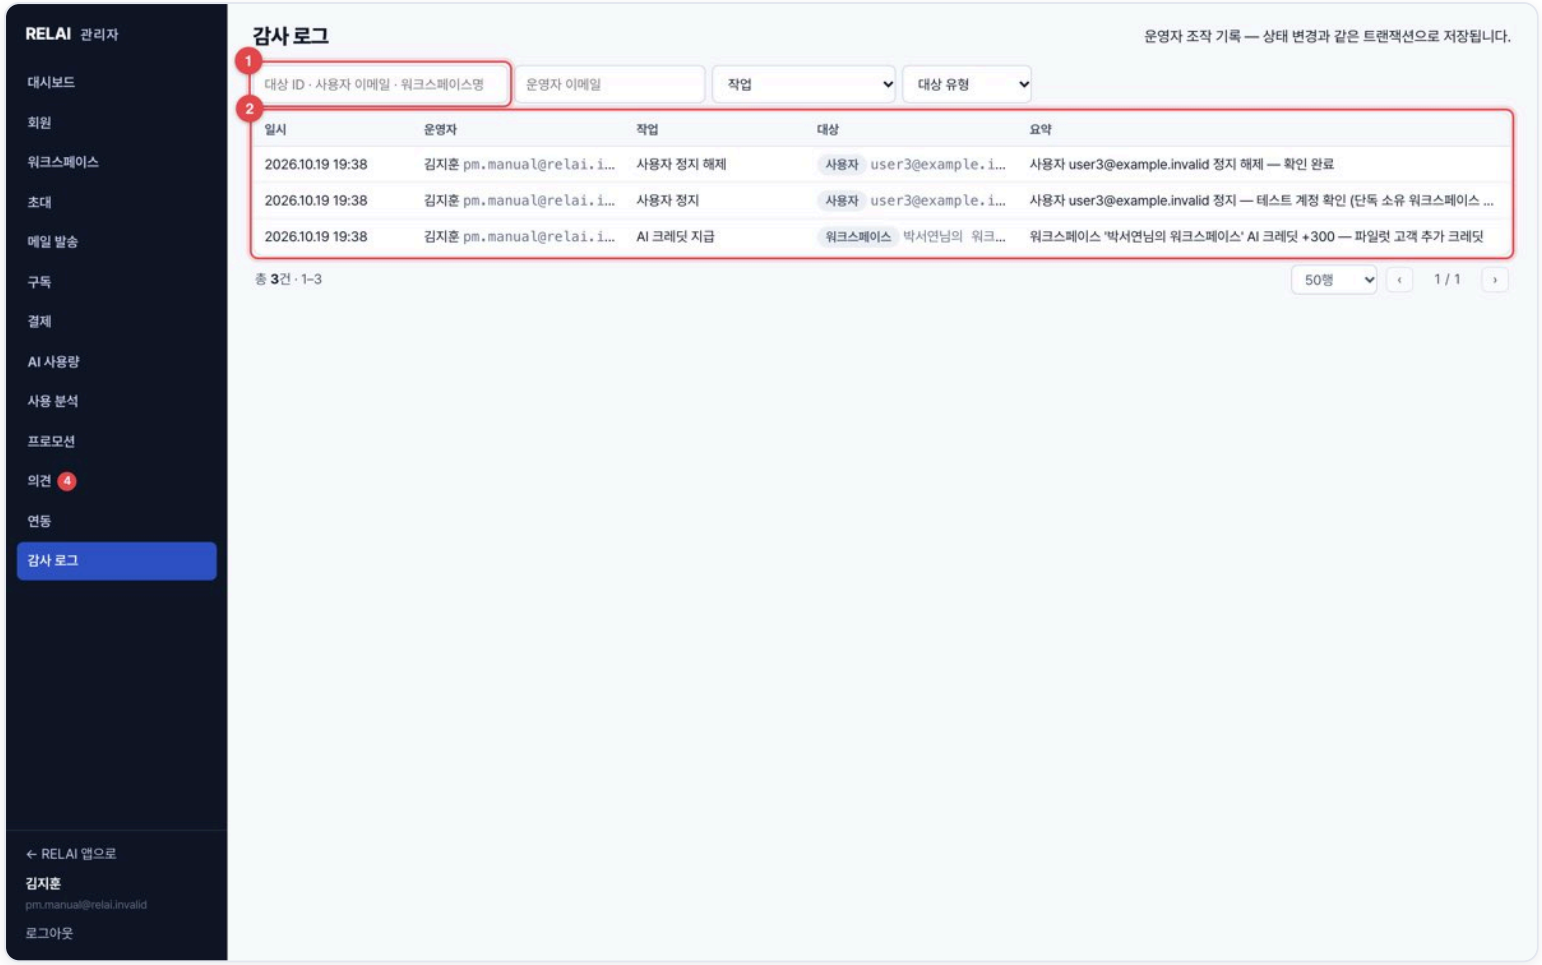

화면 번호 설명


1. 검색 — 대상 ID·사용자 이메일·워크스페이스명, 운영자 이메일, 작업, 대상 유형.
2. 기록 — 일시, 운영자, 작업(사용자 정지·해제, AI 크레딧 지급 등), 대상, 사유 요약.

무엇을	운영자가 한 조작을 모두 기록합니다.	어떻게	자동으로 쌓입니다. 정지·크레딧 지급 같은 작업은 사유 입력이 필수입니다.	결과	"누가, 언제, 왜" 바꿨는지 나중에 확인할 수 있습니다.

10. 휴대폰에서 보기

휴대폰은 보기 전용입니다. 프로젝트 만들기와 수정, 관리자 콘솔은 PC에서 합니다.

휴대폰 화면

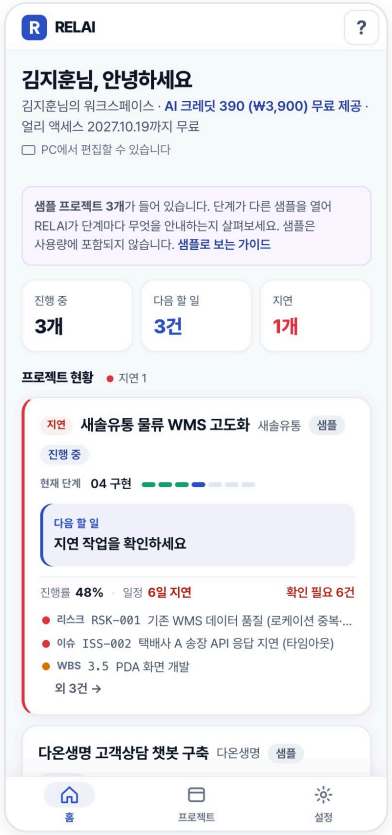

홈




다음(지금 할 일)



이슈·리스크



일정(WBS)



PC 전용 안내

무엇을	이동 중에 진행 상황, 할 일, 이슈를 확인합니다.	어떻게	아래 탭 — 다음 · 현황 · 일정 · 보고서 · 더보기. 표는 카드 형태로 바뀝니다.	결과	편집이 필요한 화면에는 "PC에서 편집할 수 있습니다"가 표시됩니다.
